

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司
烟花爆竹储存仓库迁建项目

安全验收评价报告

法定代表人：马 浩

技术负责人：侯 英

评价项目负责人：周水波

评价报告完成日期：二〇二三年十二月七日

（安全评价机构公章）

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	周水波	S011044000110192002624	023583	
项目组成员	周水波	S011044000110192002624	023583	
	喻荷兰	1800000000201251	034105	
	邹文斌	S011032000110192001449	024656	
	方逊圣	1800000000300377	034337	
	卢柄衡	1700000000301577	031440	
报告编制人	周水波	S011044000110192002624	023583	
	方逊圣	1800000000300377	034337	
	卢柄衡	1700000000301577	031440	
报告审核人	李金星	S011032000110202000779	040588	
过程控制负责人	朱细平	S011035000110202001361	027047	
技术负责人	侯英	0800000000103231	003965	

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目 安全评价（检测检验）技术服务承诺书

一、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价（检测检验），确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价（检测检验）报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2023年12月07日

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司 烟花爆竹储存仓库迁建项目安全验收评审意见回复

类型	序号	专家评审意见	意见修改回复
项目 现场 意见	1	部分仓库安全要素牌与设计图纸不一致，未明确责任人。	仓库安全要素牌已与设计图纸一致，已明确责任人。
	2	部分仓库堆码线不符合规范要求。	仓库堆码线已按要求施划。
	3	部分仓库门缝大，7#仓库装卸平台侧面未设置斜坡。	部分仓库门缝大的已封闭，7#仓库装卸平台侧面已设置斜坡。
	4	11#回收库门前明沟应设置盖板，门的耐火极限不符合要求，通风窗未设置丝网。	11#回收库门前明沟已设置盖板，门已涂防火漆，通风窗已设置丝网。
	5	库区未设置“一图一牌三清单”。	库区已设置“一图一牌三清单”。
验收 报告 意见	1	完善易制爆危险化学品的辨识。	已完善易制爆危险化学品的辨识。见 P34，3.9.6 易制爆危险化学品辨识。
	2	完善项目选址安全检查表。	已完善项目选址安全检查表。见 P45 至 P47，表 5.2-1 选址与总平面布置检查表。
	3	完善相关附图。	已完善相关附图。见报告附件资料。
	4	补充相关安全管理制度的符合性评价。	已补充相关安全管理制度的符合性评价。见 P43 至 P45，表 5.1-1 资料审核单元表。
	5	补充专家提出的现场问题的整改落实情况。	已补充专家提出的现场问题的整改落实情况。见 PP62、P63，6.2 整改意见及整改复查情况和报告附件 3 整改回复及整改后照片。
	6	专家提出的其它意见	已按专家提出的其它意见修改。

前 言

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司成立于 2007 年 09 月 07 日，2019 年 07 月 19 日经上饶市广丰区市场监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码为 91361122664792725N，法定代表人：柯兰香。住所位于江西省上饶市广丰区芦林街道塘溪村方家山，注册资本伍拾万元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：C、D 级烟花类，C 级爆竹类销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021 年 09 月 17 日经上饶市应急管理局颁发烟花爆竹经营（批发）许可证，证书编号为（赣）PF[2021]00083，主要负责人柯兰香，仓储设施地址位于江西省上饶市广丰区芦林街道塘溪村方家山，许可范围：组合烟花类（C、D）级、架子烟花类（C）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（C）级、升空类（C）级、旋转类（C、D）级、喷花类（C、D）级、爆竹类（C）级；有效期：2021 年 09 月 17 日至 2024 年 09 月 16 日。

根据 2022 年 08 月 22 日上饶市广丰区人民政府专题会议纪要（上饶市广丰区人民政府办公室第 33 号）精神，同意由上饶市广丰区发展和改革委员会对该公司搬迁到洋口镇范围内的烟花爆竹仓库储存项目依法依规予以立项。2022 年 08 月 24 日上饶市广丰区发展和改革委员会就该项目下发了《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2208-361122-04-01-682935，项目建设地址位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，符合项目备案有关规定。

依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 36 号）（2015 年修正）的规定，“生产经营单位新建、改扩建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，该项目已按照“三同时”程序进行，该公司委托江西省赣华安全科技有限公司于 2023 年 04 月出具《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全预评价报告》，委托山东鸿运工程设计有限公司进行安全设施设计，并取得由上饶市应急管理局颁发《上饶

市烟花爆竹批发企业新改、扩建项目设计审查备案意见书》（编号 202301），经过设计变更后于 2023 年 10 月出具《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全设施设计》。

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保项目符合国家相关的法律、法规、标准和规范，保障从业人员的安全与健康，受该公司委托，南昌安达安全技术咨询有限公司对该公司烟花爆竹储存仓库迁建项目进行安全验收评价。

本次安全评价以该公司新建的烟花爆竹仓储、设施及安全管理现状为对象，以实现安全经营为目的，按照《烟花爆竹工程设计安全标准》

（GB50161-2022）和《烟花爆竹安全评价规范》（AQ4113-2008）规定，对该项目进行了现场检查，对其存在的危险、有害因素进行了辨识和定性、定量评价，该公司储存单元不构成烟花爆竹重大危险源，储存经营过程主要危险有害因素为火灾、爆炸。评价组在与该企业的主要负责人充分沟通的基础上，提出了现场检查意见。该企业立即按照检查中提出的意见迅速组织了整改，并提交了关于整改后的相关资料，评价小组至现场对整改项进行了复查，在此基础上，评价组进行了安全验收评价报告的编制工作。

本评价报告结论的主要支撑依据是：被评价企业提供的书面资料、检查时评价项目的现状以及本评价机构采用的评价方法和相关技术标准等。当危险场所的环境、储存的品种、数量、安全设施和企业安全管理状况发生了不符合国家和行业相关规定的变化时，或已经超过国家规定的安全评价的时限，本报告评价结论将不再适用。

该企业应按国家有关规定，将本报告送当地应急管理部门、有关行政主管部门备案。

关键词：烟花爆竹 烟花爆竹储存仓库迁建项目 安全验收评价

目 录

1	安全评价概述	1
1.1	评价目的	1
1.2	评价原则	1
1.3	评价依据	2
1.4	评价范围	5
1.5	评价程序	5
2	企业的基本情况	7
2.1	企业概况	7
2.2	项目概况	8
2.3	厂区自然及地质环境条件	9
2.4	企业经营流程	10
2.5	主要经营设施	11
2.6	安全、消防设施	13
2.7	库区内外部安全距离	15
2.8	企业安全管理情况	18
2.9	公用工程	20
3	主要危险、有害因素辨识与分析	22
3.1	危险、有害因素分析方法	22
3.2	烟花爆竹危险有害因素分析	23
3.3	储运过程危险性分析	25
3.4	主要设备危险有害因素分析	27
3.5	环境危险因素分析	27
3.6	人员因素危险性分析	28
3.7	事故发生与扩大因素综合分析	29
3.8	重大危险源辨识	30
3.9	特殊危险化学品辨识	33
3.10	事故案例分析	34

4	评价单元的划分及评价方法的选择	38
4.1	评价单元的划分	38
4.2	评价方法的选择	38
4.3	评价方法简介	39
5	定性、定量评价	43
5.1	资料审核单元安全评价	43
5.2	总体布局、条件和设施评价	45
5.3	安全防护设施、措施评价	48
5.4	周边环境危险性评价	49
5.5	重大危险源评价	50
5.6	现场检查情况	50
5.7	储存运输作业单元评价	53
5.8	重大事故隐患判定	55
5.9	建设项目安全“三同时”检查单元评价	56
5.10	综合分析评价结果	61
6	安全对策措施、建议及整改	62
6.1	安全对策措施建议的依据及原则	62
6.2	整改意见及整改复查情况	62
6.3	安全管理对策措施及建议	63
6.4	安全技术对策措施及建议	66
6.5	其他对策措施及建议	67
7	安全验收评价结论	70
7.1	评价结果	70
7.2	评价结论	71
	附件目录	74

1 安全评价概述

1.1 评价目的

1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格规范烟花爆竹销售企业库房仓储安全使用条件，坚持客观、科学、公正的安全评价原则。

2、依据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法律、法规和标准，运用系统安全工程方法，通过安全评价，对烟花爆竹储存仓库在储存经营过程中存在的危险、有害因素进行识别，分析烟花爆竹储存仓库发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，有针对性地提出改进措施和建议，提高安全管理和安全保障水平，判断烟花爆竹储存库安全条件符合有关法律法规、国家标准和行业标准的程度。

3、为应急管理部门实施安全监察、管理提供依据。

1.2 评价原则

以被评价的烟花爆竹销售企业具体情况为基础，科学、公正、合法和有针对性地开展安全评价工作。遵循的安全评价工作原则是：以国家和行业发布的有关安全生产方针政策、法律法规和标准规范为依据，运用定量和定性的评价方法对建设项目或生产储存使用单位存在的职业危险、有害因素进行识别、分析和评价，提出预防、控制、治理对策措施，为建设单位储存烟花爆竹产品降低事故发生的风险和政府部门进行安全生产监督管理提供科学依据。

1.3 评价依据

1.3.1 相关法律、法规

表 1.3-1 相关法律、法规一览表

序号	名称	文号
1	《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令第 70 号，2002 年 6 月 29 日；主席令第 88 号修正，2021 年 6 月 10 日
2	《中华人民共和国消防法》	国家主席令[2021]第 81 号
3	《中华人民共和国职业病防治法》（2018 年修正）	国家主席令[2011]第 52 号
4	《中华人民共和国气象法》（2016 年修正）	国家主席令[2016]第 57 号
5	《安全生产许可证条例》	国务院令第 397 号，2004 年 1 月 13 日；第 653 号修正，2014 年 7 月 29 日。
6	《烟花爆竹安全管理条例》（2016 年修正）	国务院令第 455 号，2006 年 1 月 21 日；第 666 号修正，2016 年 2 月 6 日。
7	《工伤保险条例》	国务院令第 375 号，2003 年 4 月 27 日，第 586 号修正，2010 年 12 月 20 日。
8	《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》	原国家安全监管总局令第 54 号，2012 年 7 月 1 日。
9	《危险化学品目录》	原国家安全监管总局公告 2015 年第 5 号
10	应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知	应急管理部办公厅通知，2022 年 11 月 28 日
11	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知	财资[2022]136 号，2022 年 11 月 21 日。
12	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》	原国家安全监管总局令第 40 号；第 79 号令修正，2015 年 5 月 27 日。
13	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》	国家安监总局第 36 号令 2010 年 12 月 14 日，总局令第 77 号修正，2015 年 4 月 2 日。
14	《烟花爆竹生产经营安全规定》	原国家安全监管总局令第 93 号，2018 年 1 月 15 日。
15	《生产经营单位安全培训规定》	国家安监总局第 63 号令 2013 年 8 月 29 日；第 80 号令修正，2015 年 5 月 29 日）

序号	名称	文号
16	《生产安全事故应急预案管理办法》	安监总局 2016 第 88 号
17	《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》	中华人民共和国应急管理部令第 2 号
18	《江西省安全生产条例》	2007 年 3 月 29 日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017 年 7 月 26 日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019 年 9 月 28 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023 年 7 月 26 日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订。
19	《江西省消防条例》	1995 年 12 月 20 日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正
20	《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》	2018 年 10 月 10 日江西省人民政府令第 238 号发布，2021 年 6 月 9 日江西省人民政府令第 250 号第一次修正

1.3.2 主要标准、规范

表 1.3-2 主要标准、规范一览表

序号	名称	标准号
1	《烟花爆竹工程设计安全标准》	GB50161-2022
2	《烟花爆竹作业安全技术规程》	GB11652-2012
3	《烟花爆竹 安全与质量》	GB10631-2013
4	《烟花爆竹 抽样检查规则》	GB/T10632-2014
5	《建筑设计防火规范》（2018 版）	GB50016-2014
6	《危险化学品仓库储存通则》	GB15603-2022
7	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》	GB17914-2013
8	《毒害性商品储存养护技术条件》	GB17916-2013
9	《生产过程危险和有害因素分类与代码》	GB/T13861-2022

序号	名称	标准号
10	《危险货物品名表》	GB12268-2012
11	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
12	《粉尘防爆安全规程》	GB15577-2018
13	《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》	GB/T3836.1-2021
14	《安全标志及其使用导则》	GB2894-2008
15	《安全色》	GB2893-2008
16	《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB50058-2014
17	《供配电系统设计规范》	GB50052-2009
18	《20kV及以下变电所设计规范》	GB50053-2013
19	《低压配电设计规范》	GB50054-2011
20	《通用用电设备配电设计规范》	GB50055-2011
21	《系统接地的型式及安全技术要求》	GB14050-2008
22	《防止静电事故通用导则》	GB12158-2006
23	《烟花爆竹安全生产标志》	AQ4114-2011
24	《烟花爆竹防止静电通用导则》	AQ4115-2011
25	《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010
26	《企业职工伤亡事故分类》	GB6441-1986
27	《安全评价通则》	AQ8001-2007
	《安全验收评价导则》	AQ8003-2007
28	《烟花爆竹企业安全评价规范》	AQ4113-2008
29	《烟花爆竹流向登记通用规范》	AQ4102-2008
30	《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》	AQ4111-2008
31	《烟花爆竹出厂包装检验规程》	AQ4112-2008
32	《烟花爆竹重大危险源辨识》	AQ4131-2023
33	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB/T29639-2020
34	《中国地震动参数区划图》	GB18306-2015
35	《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》	AQ4101-2008
36	《烟花爆竹 化工原材料使用安全规范》	AQ4129-2019

1.3.3 其他相关技术文件、资料

- 1、委托书
- 2、上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司总平面布置图
- 3、其他相关技术资料

1.4 评价范围

本次评价根据企业提供的相关评价资料，对新建的烟花爆竹仓库（5号爆竹成品仓库、6号烟花成品仓库、9号烟花成品仓库）、改建的烟花爆竹仓库（7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库、11号回收库）、辅助设施（1号办公楼、2号生活用房、3号值班室、4号监控室、12号消防器材室、13号岗哨、14号水泵房）的总平面布置及周边环境、建筑结构、定员定量、公用工程、消防、监控、防雷防静电设施、储存及经营管理进行安全评价。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

若储存场所、品种和储存条件发生变化，本报告评价结论将不再适用。

1.5 评价程序

本次安全验收评价程序：

1、前期准备工作：接受被评价单位委托，（签订技术服务协议），明确被评价对象和范围，组建安全评价小组，了解被评价项目的情况，收集相关法律法规、技术标准及与评价项目相关的安全数据资料。

2、危险、有害因素识别与分析：根据该库区周边环境、安全管理和安全设施情况，识别和分析库区存在的危险、有害因素及其可能导致事故发生的类型和机理。

3、划分评价单元：根据储存库的特点，将该库区的安全评价划分为9个单元进行，即安全生产基本资料审核单元、总体布局、条件和设施单元、

安全防护措施、措施单元、周边环境危险性单元、重大危险源单元、现场检查单元、储存运输作业单元、重大事故隐患判定单元、建设项目“三同时”检查单元。

4、定性、定量评价：在危险、有害因素识别和分析的基础上，选择科学、合理、适应的评价方法，对可能导致事故发生的危险、有害因素进行定性、定量分析评价，给出危险、有害因素可能引起事故发生的可能性和严重性，为制定安全对策措施提供科学依据。

5、提出安全对策措施及建议：根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

6、安全评价结论：在对评价结果分析归纳和整合的基础上，做出安全评价结论，并指出应重点防范的重大危险因素及安全对策措施。

7、编制安全评价报告：综合安全评价情况，依据相关安全评价的标准和规范要求编制安全验收评价报告。

评价程序详见下图 1.5-1。

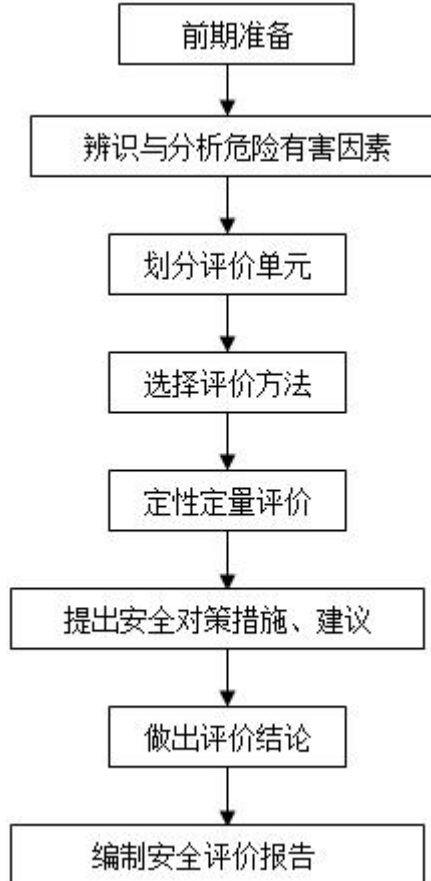


图 1.5-1 安全验收评价程序框图

2 企业的基本情况

2.1 企业概况

1、单位名称：上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司

2、法定代表人：柯兰香

3、注册资本：伍拾万元整

4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、此次申请许可经营范围：组合烟花类（C、D）级、架子烟花类（C）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（C）级、升空类（C）级、旋转类（C、D）级、喷花类（C、D）级、爆竹类（C）级。

6、运输情况：企业烟花爆竹产品委托有资质的宜春市科瑞志成物流有限公司进行运输，签订有运输委托合同，并配备驾驶员、押运员。

7、企业简介

该公司目前暂定员 7 人，其中主要负责人 1 人，安全管理人员 2 人，特种作业人员 4 人。

该公司新建烟花爆竹仓库位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，其中心点地理坐标：东经 118.083346°，北纬 28.354456°。

该公司位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，库区占地面积约为 87 亩，库区功能分区主要分为办公生活区、值班监控区和储存区。办公生活区布置于库区围墙外东南面 244 米处、值班监控区布置于库区东南面 40 米处。利用谿家水库为消防蓄水池，位于库区东面，水泵房布置于值班监控区西面。

储存区设有 1.3 级烟花爆竹仓库 6 栋和预留成品仓库位置 1 块，其中 5 号爆竹成品仓库面积为 480m²，1 间，设计储存药量为 9000kg；6 号烟花成品仓库面积为 990m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg；7 号爆竹成品仓库面积为 466m²，1 间，设计储存药量为 10000kg；8 号烟花成品仓库面积为 941m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg；9 号烟花成品仓库面积为 980m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg；11 号回收库面积为 128m²，1 间，设计储存药量为 500kg。10 号预

留成品仓库位置位于 9 号烟花成品仓库北面 and 11 号回收库西南面，距离 9 号烟花成品仓库 41 米、距离 11 号回收库 59 米。5 号、7 号爆竹成品仓库主要储存爆竹类（C）级产品，6 号、8 号、9 号烟花成品仓库主要储存组合烟花类（C、D）级、架子烟花类（C）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（C）级、升空类（C）级、旋转类（C、D）级、喷花类（C、D）级，11 号回收库主要储存回收产品。

2.2 项目概况

1、建设地址：江西省上饶市广丰区洋口镇古城村。建设项目地理位置详见下图 2.3-1。

2、建设内容

1) 新建 1.3 级烟花爆竹仓库 3 栋，5 号爆竹成品仓库面积为 480m²，1 间，设计储存药量为 9000kg；6 号烟花成品仓库面积为 990m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg；9 号烟花成品仓库面积为 980m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg。

2) 改建 1.3 级烟花爆竹仓库 3 栋，7 号爆竹成品仓库面积为 466m²，1 间，设计储存药量为 10000kg；8 号烟花成品仓库面积为 941m²，中间用实体墙分隔成两间，设计储存药量为 20000kg；11 号回收库面积为 128m²，1 间，设计储存药量为 500kg。

3) 利用谏家水库为消防蓄水池，消防蓄水池容量大于 1000m³，配有水泵房，内设有消防水泵两台（一用一备），型号 XBD5.0/30G-L，可满足库区消防要求。

4) 辅助用室 7 栋，1 号办公室、2 号生活用房、3 号值班室、4 号监控室、12 号消防器材室、13 号岗哨、14 号水泵房。

5) 库区四周设置围墙、各仓库设有防雷、防静电设施，视频监控设备。
该项目总投资约 300 万元，公司目前暂定员 7 人，其中：主要负责人 1 人、安全管理人员 2 人、特种作业人员 4 人。

该项目仅为烟花爆竹成品储存，不涉及到烟花爆竹的生产工艺。

储存规模及经营方案：

表 2.2-1 主要经营产品的需求和来源见下表

序号	品名	规格	储存规模	计划年经营量	包装形式	来源
1	烟花（6号、8号、9号烟花成品仓库）	C、D级	60000kg	2.5万箱/年	普通纸箱	外购
2	爆竹（5号、7号爆竹成品仓库）	C级	19000kg	3.5万箱/年	普通纸箱	外购

2.3 厂区自然及地质环境条件

1、地理位置

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，其中心点地理坐标：东经 118.083346，北纬 28.354456。

广丰区隶属江西省上饶市，位于江西省东北部，东接浙江省江山市，北邻玉山县，西毗上饶市广信区、信州区，南接福建省浦城、崇安两县。区境南北长 62.5 千米，东西宽 45 千米，区域面积 1377 平方千米。

建设项目区域位置图 2.3-1。

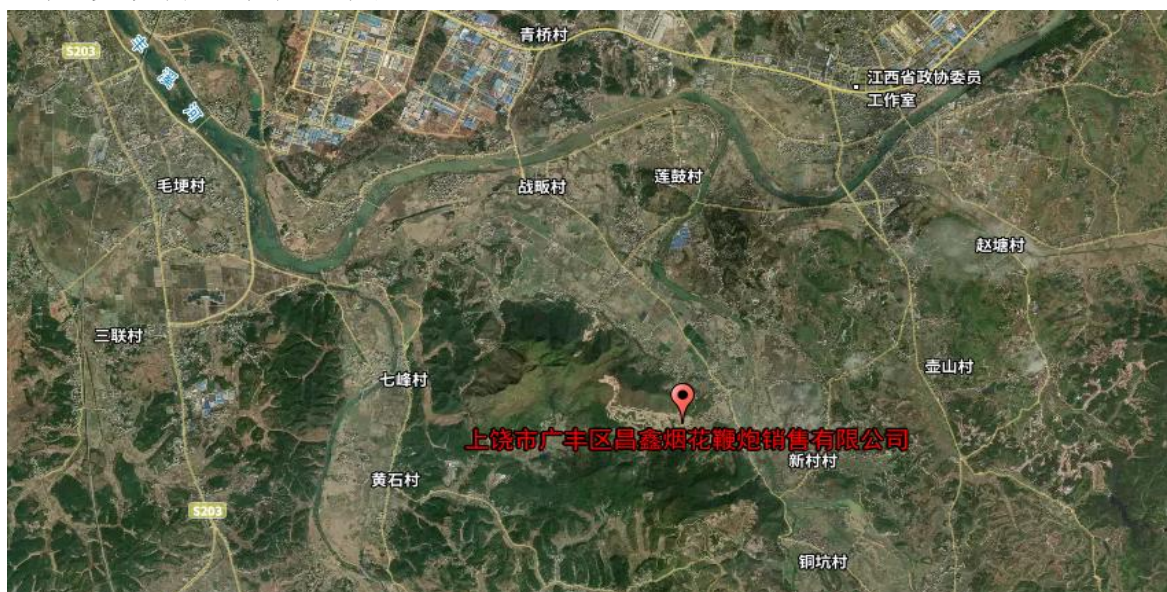


图 2.3-1 区域位置图

2、地形地貌

广丰地处武夷山北麓低山丘陵，属半丘陵半山区，地势东南高、西北低。东南部群山连绵，峰峦叠嶂。有海拔千米以上的山峰 102 座，铜钹山主峰海

拔 1534.6 米。县境中部、北部和西部均属起伏丘陵，地势平缓，县城海拔 95 米，县内最低处为西端和北端，海拔均为 72 米。整个地势从东南向西北渐次倾斜，形成半山区半丘陵的地貌特征。

3、气候环境

广丰属亚热带季风气候，年平均无霜期 266 天，多年平均气温 17.9℃，年平均降雨量 1661.6 毫米。

4、地震烈度

根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地域抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。因此项目建筑物抗震设防烈度按 6 度进行设防。

5、水源

该项目利用谏家水库为消防蓄水池，消防蓄水池容量大于 1000m³，配有水泵房，消防蓄水池补水水源来自地下水和自然雨水。

2.4 企业经营流程

烟花爆竹由生产厂家送货上门，进库后分类堆码储存。批发销售由烟花爆竹专用车送货到烟花爆竹零售点。

2.4.1 储存工艺流程

该公司选择经应急管理部门批准取得安全生产许可证的企业供货。入库前检查供货方是否有《产品检测证明》、《产品检验合格证》、《运输证》，否则拒绝接收入库。入库前能依据合同检查产品品种、数量是否相符，抽样检查产品外观及包装质量。储存产品过程中，保证温度低于 45℃，湿度在 85%以下，并有记录。入库时，由保管员填写《产品入库登记表》，详见下图 2.4-1。




图 2.4-1 入库工艺流程框图

2.4.2 配送工艺流程

该公司烟花爆竹从外单位烟花爆竹生产厂家进货，产品由具有生产许可证的单位提供，且成品需经检验合格，产品包装标注符合《危险货物包装标志》的要求。由企业管理人员到生产厂家或上一级批发单位选择货物、检验、订购后，直接由供货企业运货汽车运入库区内，将卸货口与卸货平台相接，用人工将整箱烟花运至仓库内按分类分级存放的要求堆码好。

出库时，保管员填写《产品出库登记表》，搬运、装卸人员进行出库作业，由专用的危爆车辆进行烟花爆竹配送运输服务，并配备专业危险货物运输人员及押运人员，安全送至取得烟花爆竹零售经营许可证的零售网点。详见下图 2.4-2。




图 2.4-2 配送工艺流程框图

2.4.3 配送车辆

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司委托宜春市科瑞志成物流有限公司对本公司烟花爆竹成品运输到零售网点，宜春市科瑞志成物流有限公司道路运输经营许可证号为赣交运管许可宜字 360900211540 号，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜设备），危险货物运输（1 类 4 项），危险货物运输（第 3 类），危险货物运输（第 9 类），证件有效期至 2024 年 07 月 14 日。配备危险货物运输车辆 2 辆：赣 C2M987，并配有驾驶员、押运员，均取得资质证书，详见附件。

2.5 主要经营设施

2.5.1 建筑结构和内容

1、5 号爆竹成品仓库、6 号烟花成品仓库、9 号烟花成品仓库为新建，仓库结构采用砖混结构，墙体采用 240mm 实心墙，室内净空高度均为 4.8m，耐火等级为二级，不低于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018

版)中耐火等级的规定。

2、7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库、11号回收库为改建，仓库结构原采用砖混结构，墙体采用240mm实心墙，室内净空高度均为4.8m，7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库屋面原采用钢梁彩钢瓦结构，11号回收库将原木梁琉璃瓦屋面改造为钢梁彩钢瓦结构；耐火等级为二级，不低于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)中耐火等级的规定。

3、7号爆竹成品库南端靠东南角应采用无门窗洞口的防火墙封闭一部分，8号烟花成品仓库西端一段采用无门窗洞口的防火墙封闭一部分。

4、建筑砖墙厚度为240mm。

5、采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。

6、安全出口为外开启的平开门，11号回收库门的耐火等级不符合要求。

7、成品库地面采用混凝土地面。

8、5号、7号爆竹成品仓库设置3个安全出口；6号、9号烟花成品仓库设置6个安全出口仓库中间设置有防火墙，将其分为2个防火分区，每个分区设有3个安全出口，8号烟花成品仓库设置4个安全出口；11号回收库设置2个安全出口；各仓库内任一点至安全出口的距离均小于15m。

9、仓库高位设有百叶通风窗，并配置金属网，在勒脚处设置铁栅栏通风窗和金属网，并采取防止小动物进入的措施。11号回收库通风窗未设置丝网。

10、5号爆竹成品仓库、6号烟花成品仓库、8号烟花成品仓库、9号烟花成品仓库门设有装卸平台，装卸平台一侧设有缓坡，一侧设有台阶，后门设有应急通道，仅供人员疏散通道。11号回收库未设置装卸平台。7号爆竹成品仓库装卸平台侧面未设置斜坡。

2.5.2 库区建(构)筑物

库区建(构)筑物的名称及内容见下表2.5-1。

表2.5-1 建(构)筑物一览表

序号	建、构筑物名称	长×宽(m)	建筑面积(m ²)	耐火等级	建筑结构	危险等级	设计药量	备注
1	办公室		378	二级	砌体承重结构	无药		原建

序号	建、构筑物名称	长×宽(m)	建筑面积(m ²)	耐火等级	建筑结构	危险等级	设计药量	备注
2	生活用房		360	二级	砌体承重结构	无药		原建
3	值班室		40	二级	砌体承重结构	无药		原建
4	监控室		64	二级	砌体承重结构	无药		原建
5	爆竹成品仓库	30×16	480	二级	砖混结构	1.3	9000kg	新建
6	烟花成品仓库	33×30	990	二级	砖混结构	1.3	20000kg	新建
7	爆竹成品仓库		466	二级	砖混结构	1.3	10000kg	改建
8	烟花成品仓库		941	二级	砖混结构	1.3	20000kg	改建
9	烟花成品仓库	35×28	980	二级	砖混结构	1.3	20000kg	新建
10	回收库		128	二级	砖混结构	1.3	500kg	改建
11	消防器材室		97	二级	砖混结构	无药		原建
12	岗哨		22	二级	砖混结构	无药		原建
13	水泵房	2.5×2	5	二级	砖混结构	无药		新建，配备2台消防泵，一用一备

2.6 安全、消防设施

2.6.1 消防设施

1、消防用水

库区利用南面谏家水库为消防蓄水池，消防蓄水池容量大于 1000m³。

2、消防器材设置

库区成品库面积最大为 990 m²，根据 GB50161-2022《烟花爆竹工程设计安全标准》第 9.0.5 条的规定：危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中甲类厂房和仓库的规定。当单个建（构）筑物的体积均不超过 300m³ 时，室外消防用水量可按 10L/s 计算。库区成品库最大体积为：990 m²×4.8m=4752m³。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中表中的规定，建筑体积为 3000m³<V≤5000m³ 的甲、乙类仓库，室外消防用水设计水量按 25L/s 计，则一次室外消防用水量的体积 V=3×25×3600/1000=270m³，库区

内设有容量大于 1000m³ 的消防蓄水池，能满足消防用水的要求。在消防蓄水池旁设置了水泵房，水泵房内配备了两台型号 XBD5.0/30G-L 消防泵（一用一备），流量 30L/s，并配备室外消火栓、水带、水枪。库区安装有 5 个室外消火栓，监控室按要求配置手提式气体灭火器，烟花爆竹成品仓库每栋均按要求配置干粉灭火器。

该公司烟花爆竹仓库位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，库区大门前有一条乡道，交通十分便利，必要时可请求广丰区消防队。

2.6.2 安全设施

1、通风：烟花爆竹仓库采用自然通风，库内设置高位通风窗和地脚窗。

2、防火：烟花爆竹仓库建筑物的火灾危险性为甲类。仓库周边已清理防火隔离带，防止界外火灾对库区的影响，依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第 7.1.2 第三条规定，每个防火分区面积不大于 500m² 进行设置，烟花爆竹仓库内部设有防火墙。

3、防潮：烟花爆竹仓库设有防潮层且储存库内地面高于库房地面高度。

4、电气设备：仓库内未设照明设施，门卫室设置普通照明灯。

5、防雷、防静电设施

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的规定，该公司烟花爆竹仓库防雷等级为二类防雷。

（1）该公司烟花爆竹仓库于 2023 年 11 月 6 日经吉林华云气象科技有限公司进行防雷装置检测，并出具合格的《江西省雷电防护装置检测报告》，报告编号 1072017009 雷检字[2023]E0305，有效期至 2024 年 5 月 5 日。

（2）在仓库入口处设置静电释放触摸球，于 2023 年 11 月 4 日经国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站进行防静电检测，并出具合格的检验检测报告，报告编号 YCJQ2023-0177，有效期至 2024 年 5 月 3 日。

6、安全防范和报警系统

该公司由上饶赣鲁网络有限公司负责按照《烟花爆竹企业安全监控系统

通用技术条件》AQ4101-2008 的要求进行安装视频监控设备。于 2023 年 09 月由安装单位自检出具网络视频监控系统验收报告。共有 7 个监控区域，其中 4 号监控室监控进出口区域 2 个，5 号爆竹成品仓库监控区域 4 个，6 号烟花成品仓库监控区域 4 个，7 号爆竹成品仓库监控区域 4 个，8 号烟花成品仓库监控区域 4 个，9 号烟花成品仓库监控区域 6 个，11 号回收库监控区域 2 个，13 号岗哨监控区域 2 个。

监控终端设置在库区监控室内，监控设施配备 UPS 备用电源。公司安排了 2 名专职人员轮班进行本地 24h 不间断查看监控情况。所有监控视频资料保留不少于 30 天。

门卫室内配备有固定手机 15307036899，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第 12.11.3 章节“当危险品生产区和危险品总仓库区不设置火灾自动报警系统时，可采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置”。

7、防护屏障

该公司烟花爆竹仓库均为 1.3 级仓库，可不设置防护屏障。

8、其他安全设施

仓库门口安全标识牌及安全警示标志，仓库内设置温湿度计及记录本，库区大门设置限速标志。

2.7 库区内外部安全距离

2.7.1 选址规划和外部距离

1、选址

该项目新建仓库选址位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，地形为山地，地貌相对简单。

根据总平面布置图及现场周围环境，东面为农田，南面为民房，西面为原花炮企业（已退出）闲置房，北面为山地。远离国道省道、工矿企业、机关学校和村民居民区，库区外有条乡道公路通过。

2、外部距离

烟花爆竹仓库与周边建、构筑物的外部距离详见下表 2.7-1：

表 2.7-1 仓库外部设施距离明细表

方位	库房编号及用途	危险等级	药物限量(kg)	周边毗邻情况	实际距离(m)	标准距离(m)	结论
东面	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	外部环境 100m 范围内为农田, 无其它安全影响设施	大于 100	65	合格
南面	8号烟花成品仓库	1.3	20000	谏家村(50人以上)	175	140	合格
	9号烟花成品仓库	1.3	20000	谏家村(50人以上)	189	140	合格
西面	9号烟花成品仓库	1.3	20000	原花炮企业(已退出)闲置房	87	85	合格
北面	11号回收库	1.3	500	外部环境 200m 范围内为山地, 无其它安全影响设施	大于 200	35	合格
东北面	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	庙(50人以下, 非常住)	78	65	合格
	6号烟花成品仓库	1.3	20000		89	85	合格
	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	李家(50人以上)	105	105	合格
	6号烟花成品仓库	1.3	20000		148	140	合格

2.7.2 总平面布置和内部距离

1、总平面布置

本项目库区占地面积约 87 亩, 项目场地位于江西省上饶市广丰区芦林街道塘溪村方家山, 从地理位置上看, 处于相对独立的区域, 便于管理(设置独立的围墙)。按照总平布置原则, 结合项目选址地形和周边环境情况布置仓库区, 库区东南面 244 米处设置办公生活区, 库区东南面 40 米处设置值班监控区, 值班监控区西面设置水泵房, 利用库区外南面的谏家水库为消防蓄水池。东南面设置库区主出入口, 库区主出入口旁设置 3 号值班室、4 号监控室、14 号水泵房, 库区内由东往西依次布置 5 号爆竹成品仓库、6 号烟花成品仓库、8 号烟花成品仓库、7 号爆竹成品仓库、11 号回收库、9 号烟花成品仓库。库区北面偏东设置库区次出入口, 库区次出入口旁设置 13 号岗哨。

5 号爆竹成品仓库、7 号爆竹成品仓库、11 号回收库按一个防火分区设置, 防火分区面积均不大于 500m^2 ; 6 号烟花成品仓库、8 号烟花成品仓库、9 号烟花成品仓库按两个防火分区设置, 防火分区面积均不大于 500m^2 , 6 栋

烟花爆竹成品仓库均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》7.1.2 第三条“每个防火分区面积不大于 500m²”的要求。库区布置详见所附《总平面布置图》。

2、内部距离

烟花爆竹仓库内部距离详见下表 2.7-2。

表 2.7-2 库区内部构筑物距离明细表

仓库名称	相邻建、构筑物	实际距离/m	标准距离/m	结论
5 号爆竹成品仓库 (1.3 级、定量 9000kg)	3 号值班室	45	40	合格
	4 号监控室	40	40	合格
	6 号烟花成品仓库, 1.3 级、定量 20000kg	43	40	合格
	8 号烟花成品仓库 1.3 级、定量 20000kg	81	40	合格
	主干道	22	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格
6 号烟花成品仓库 (1.3 级、定量 20000kg)	7 号爆竹成品仓库, 1.3 级, 10000kg	80	40	合格
	8 号烟花成品仓库, 1.3 级, 定量 20000kg	80	40	合格
	主干道	21	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格
7 号爆竹成品仓库 (1.3 级、 10000kg)	8 号烟花成品仓库, 1.3 级, 定量 20000kg	42	40	合格
	9 号烟花成品仓库, 1.3 级, 定量 20000kg	80	40	合格
	11 号回收库, 1.3 级, 500kg	115	40	合格
	主干道	16	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格
8 号烟花成品仓库 (1.3 级、定量 20000kg)	1 号生活用房	244	85	合格
	3 号值班室	74	50	合格
	9 号烟花成品仓库, 1.3 级, 定量 20000kg	125	40	合格
	主干道	15	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格
9 号烟花成品仓库 (1.3 级、定量 20000kg)	11 号回收库, 1.3 级, 500kg	118	40	合格
	主干道	11	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格
11 号回收库 (1.3 级、500kg)	主干道	10	10	合格
	最近围墙	大于 5 米	5	合格

3、安全出口

库区东南面设有一个主要出入口, 北面偏东设置库区次出入口; 5 号、7

号爆竹成品仓库设置 3 个安全出口；6 号、9 号烟花成品仓库设置 6 个安全出口仓库中间设置有防火墙，将其分为 2 个防火分区，每个分区设有 3 个安全出口，8 号烟花成品仓库设置 4 个安全出口；11 号回收库设置 2 个安全出口；各仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15m。

4、库区道路

库区道路均已水泥硬化，库区主要道路宽 4.5m，主干道纵坡不大于 6%。

2.8 企业安全管理情况

2.8.1 安全组织机构

该公司成立了安全领导小组，任命柯兰香为该公司安全领导小组组长（主要负责人），副组长柯诗贵，成员杨美芳、张成洪、程佳文，柯诗贵为专职安全员。

2.8.2 人员培训

该公司为烟花爆竹经营企业，公司暂定员 7 人。其中主要负责人 1 人、安全管理人员 2 人，特种作业人员 4 人，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均经过相关主管部门组织的安全资格培训，考核合格并取得资格证。

按国家的有关规定企业定期为从业人员发放劳保用品，并为从业人员购买了工伤保险及安全生产责任保险。

2.8.3 安全经营管理制度

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司柯兰香是公司的法定代表人，公司的主要负责人，是企业安全第一责任人，公司实行经理负责制，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管警钟长鸣抓安全。

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了下列安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程：

1、安全生产责任制

主要包括：经理（法定代表人担任）安全生产责任制、副经理（经营、安全）安全生产责任制、财务科科长安全生产责任制、安全科科长安全生产责任制、专职安全员安全生产责任制、员工安全生产责任制、保管员安全生产责任制、等，并签订烟花爆竹经营安全责任书。

2、安全生产管理制度

主要包括：安全生产责任制度、安全管理责任制度、管理制度评审和修订制度、安全教育培训与持证上岗制度、安全投入保障及安全生产费用提取和使用制度、隐患排查整改制度、危险作业审批管理制度、动火作业管理制度、安全生产会议管理制度、产品入库检验和验收制度、仓库安全管理及保管守卫制度、烟花爆竹安全管理制度、劳动防护用具（品）配备和使用管理制度、产品流向登记管理制度、重大危险源评估与监控措施、职工及外来人员、车辆出入库区登记制度、事故应急救援、演练管理制度、事故应急救援预案、事故报告与处理管理制度、配电室安全管理制度、关键装置、重点部位安全管理制度、安全检查制度、安全设施设备管理制度、企业负责人现场带班管理制度、安全目标管理与奖惩及违规违章作业处理制度、绩效考核管理制度、风险评价制度、职业危害防治管理制度、上下班考勤管理制度、合格产品处置制度、买卖合同管理制度等。

3、安全生产操作规程

包括：仓库消防安全岗位操作规程、库房安全管理岗位操作规程、配送车辆管理岗位操作规程、配送车辆驾驶员岗位操作规程、监控检测装置岗位操作规程、库房温湿检测岗位操作规程、装卸（搬运）作业操作规程、卫生安全操作规程、燃放试验安全操作规程、拆箱操作安全操作规程、货物查验安全操作规程、车辆运输操作规程等。

2.8.4 应急救援

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，公司制定了《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司生产安全事故应急预案》，并成立了公司烟花爆竹重大事故应急救援指挥部，负责统一组织和指挥烟花爆竹重大事故救援工作，并在经营场所设置了劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗

器材等。公司设有专项资金用于购买、更新劳动保护用品、消防器材、应急器材、医疗器材等，有进行员工教育培训、应急演练的资金安排，并应组织全体员工每半年进行一次烟花爆竹事故处理演练、灭火器的使用演练。该公司应急预案于 2023 年 11 月 07 日经上饶市应急管理局进行备案，备案编号：YJYA362325-2023-3003。

2.9 公用工程

2.9.1 给排水

1、给水

1) 库区给水由库区南面谿家水库供给，谿家水库水经消防水泵抽水至消火栓。

2) 该项目为迁建项目，新建和改建的烟花爆竹仓库主要作为储存烟花爆竹使用，无生产用水，该项目主要为消防用水和生活用水，消防给水主要来自库区南面谿家水库供给，生活用水主要依托地下水井。

2、排水

库区排水主要为雨水，采用明沟排放，生活污水统一收集到化粪池处理合格后外排。

2.9.2 供配电

1、供电

库区用电来自当地 380/220V 架空电线至库区外电线杆后埋地引入值班室配电箱内，根据当地实际情况，电网供电充足，有可靠的电力保障。

根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）的规定，该项目消防水泵、生活设施用电负荷为三级负荷，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）第 10.1.2 条规定，该库区室外消防用水量为 25L/s（不大于 30L/s），因此，消防用电按三级负荷。供电电压 220V，库区门卫室照明线路采用阻燃电缆穿管埋地敷设。

2、配电

该项目采用埋地式供电方式，低压供电采用放射式与分支式结合的配电系统，低压系统接地型式为 TN-S 系统布置。路灯采用 YJV 型电力电缆镀锌钢管直埋至各用电设备，企业室内所有配电等级按《低压配电设计规范》

(GB50054-2011) 标准配置。

2.9.3 照明

仓库的采光和照明根据《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的规定设置。仓库内主要采用自然采光,不设置灯具与开关等电气设施。

3 主要危险、有害因素辨识与分析

3.1 危险、有害因素分析方法

危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。

危害是指可能造成人员伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。

危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。

辨识烟花爆竹在储存经营过程中存在的危险、有害因素必须坚持科学性、系统性、全面性和预测性相结合的原则。通常采用以下两种辨识方法。

3.1.1 经验分析法

1、对照分析法

对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。

2、类比推断法

类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作

业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。

3.1.2 系统安全分析法

系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的系统安全分析方法有预先危险性分析（PHA）、危险度分析、事件树（ETA）、事故树（FTA）、材料性质和生产条件分析法。

3.2 烟花爆竹危险有害因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、氧化铅、木炭、硫磺、硫化锑、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

该公司主要经营组合烟花、爆竹及各类小型烟花等，成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全有造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库

5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。仓库建筑、设备等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生扰动，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸企业附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

3.3 储运过程危险性分析

3.3.1 储存危险性分析

根据该公司新建烟花爆竹仓库资料分析，产品入库后，主要危险有害因素如下：

1、库房选址、建筑施工等未按照国家标准，可能导致危险后果扩大。

- 2、安全机构不健全，责任不落实，监督不到位，未及时发现安全隐患。
- 3、操作人员未经过安全知识培训，安全意识薄弱，极易产生违规操作。
 - 1) 违规抽烟可能引起燃烧爆炸；
 - 2) 违规使用铁制等容易产生火花的器具；
 - 3) 违规使用电器、火炉；
 - 4) 穿硬底鞋、带钉鞋；
 - 5) 操作时发生的撞击、挤压、摩擦、抛掷等。
- 4、接闪杆接地不好和防雷、避雷设备失效，可能导致燃烧爆炸事故。
- 5、储存药量超过定量指标，可能导致灾害扩大。
- 6、贮存环境温、湿度超标，药物受潮，不合理堆放等也可能造成反应放热、自燃起火，燃烧爆炸。
- 7、在运输过程中机动车未带火星灭火器或发生翻车、撞车等事故而产生剧烈碰撞、摩擦可能发生燃烧爆炸。
- 8、消防水池水量不足，可能导致不能及时控制灾情，后果扩大。
- 9、烟花、爆竹同存，容易由燃烧转为爆炸，使事故多发或扩大。

3.3.2 运输过程危险性分析

产品运输过程中可能因人为、车辆或环境因素的原因导致意外事故发生，可能导致的意外事故：

- 1、若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。
- 2、在运输时，因驾驶员和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。
- 3、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。
- 4、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。
- 5、运输的线路未按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。
- 6、因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间

过长、身体缺陷；

7、因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）。

8、因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。

9、运输车辆停靠时没有加强监管，引起事故的发生。

10、使用非专用车辆进行运输，造成事故的发生。

11、装卸工人违章作业，抛、摔、凿等行为导致产品爆炸。

12、运输的线路没有按照公安部门指定的线路，没有避开人员稠密区和重要场所，引起事故，并使事故扩大。

3.4 主要设备危险有害因素分析

1、烟花爆竹仓库未安装防雷防静电装置或防雷防静电装置不合格，雷击可能导致烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

2、烟花爆竹仓库内如果安装非防爆型电气设备，可能产生火花而使烟花爆竹产品燃烧、爆炸。

3、企业经营、储存过程中使用主要设备为办公设备，其电气设备等的主要危险是线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致燃烧、电击。

4、消防水池无防护设备，可能导致人员掉入水池而造成淹溺伤害。

5、火灾报警设施失效，发生烟雾、火灾等紧急情况时，不能及时报警，造成事故扩大。

6、库区视频监控系统未投用或监控摄像头损坏，造成盗窃发生事故。

3.5 环境危险因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。本节着重分析高温、潮湿、雷击对该项目的影响。

1、潮湿

烟花爆竹产品是含有镁铝合金、铝粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃

物质。所以储存库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。

建设项目如果排洪设施堵塞，遇特大、暴雨可能发生厂区淹水，产品原料受潮，电器受潮，湿度加大，并进一步引发二次事故。

2、高温

高温容易引发火灾。特别是在高温、潮湿天气，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。

3、雷击灾害

雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹产品储运构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击，其放电产生的火花，可能引起周围环境中药剂粉尘的燃烧和爆炸。

直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果危险品工库房无接闪杆、或接闪杆高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于 $10\ \Omega$ ，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。

感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹库房内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。

雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入烟花爆竹储存库内，可能造成危险品燃烧、爆炸。

3.6 人员因素危险性分析

3.6.1 人员因素

从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、

健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心理异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。

3.6.2 管理因素

管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。

由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。

3.7 事故发生与扩大因素综合分析

3.7.1 事故发生的因素分析

导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、过热点、烟火药自升温、倒垛落地、地面有药走路摩擦、静电、打雷、火花、粉尘燃烧爆炸、外来冲击波或爆炸破片、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：

- 1、能量因素
 - 1) 烟火药的配方过于敏感。
 - 2) 机械摩擦、撞击。
 - 3) 药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。

4) 温度过高或接触火源而造成事故。

5) 静电火花引起安全事故。

6) 雷电。

2、管理因素

1) 由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。

2) 由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。

3) 烟花爆竹安全教育不够。

4) 操作人员违反操作规程，超量储存。

3、社会因素

1) 掺假原材料不纯、含有杂质。

2) 故意的破坏活动。

3.7.2 事故扩大的因素分析

1、技术因素

1) 布局不合理，安全距离不符合标准。

2) 停滞药量超限量，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸。

3) 储存库强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故。

4) 安全设施不到位。

5) 飞溅物。

2、管理因素

1) 管理混乱，监督不力。

2) 调整储存库用途。

3) 应急救援采取措施不当。

3.8 重大危险源辨识

3.8.1 重大危险源辨识

按照《安全生产法》的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 为依据，对该公司

烟花爆竹仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。

1、烟花爆竹重大危险源定义

烟花爆竹重大危险源是指长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险物品生产、储存单元。对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个单元，当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传输带、转动装置等相连接时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。对于危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

2、临界量的确定依据

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹成品临界量按下表 3.8-1 确定。

表 3.8-1 烟花爆竹成品临界量 单位：吨

种类	临界量
含雷弹的礼花弹成品及其半成品； 7号及以上礼花弹成品及其半成品； 白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品	1
6号及以下礼花弹成品及其半成品； 除雷弹外的其他效果内筒； 白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品； 双响产品及其半成品	5
单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品； 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其半成品	10
个人燃放类组合烟花及其半成品； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹及其半成品	50

上表中未规定临界量的，A级烟花爆竹成品的临界量为5吨，B级烟花爆竹成品的临界量为10吨，C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50吨。

3、烟花爆竹重大危险源辨识方法

按照下式计算单元的重大危险源辨识指标

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots \dots (1)$$

式中：S --重大危险源辨识指标；

q_1, q_2, \dots, q_n --各种危险物品设计存放量，单位为吨（t）。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n --与各种危险物品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的 $S \geq 1$ 时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

3.8.2 危险物质临界量标准

该公司在储存场所中涉及的烟花爆竹品种比较多，储存的品种结构随着产品的增减经常变化，但储存的烟花爆竹是 C 级、D 级烟花和 C 级爆竹。根据该储存仓库的储存情况，按照《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 中 5.4 条规定，C、D 级烟花和 C 级爆竹的临界量均为 50 吨。

3.8.3 重大危险源辨识结果

该公司有烟花爆竹仓库 6 栋，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。评价组将 6 栋烟花爆竹储存仓库作为辨识单元进行烟花爆竹重大危险源辨识。与本项目有关的烟花爆竹的临界量列于表 3.8-2。

表 3.8-2 烟花爆竹名称及其临界量

序号	类别	烟花爆竹名称和说明	临界量（吨）
1	烟花爆竹	C、D 级烟花和 C 级爆竹	50

本评价项目的主要烟花爆竹存放地点及最大存量列于表 3.8-3。

表 3.8-3 烟花爆竹存放地点及最大存量表

危险物质名称	存放地点	实际最大存药量（吨）
爆竹	5 号爆竹成品仓库	9
烟花	6 号烟花成品仓库	20
爆竹	7 号爆竹成品仓库	10
烟花	8 号烟花成品仓库	20
烟花	9 号烟花成品仓库	20
烟花爆竹	11 号回收库	0.5

根据表 3.8-2 和表 3.8-3 所列数据，代入上（1）式子计算得：

表 3.8-4 烟花爆竹重大危险源辨识结果表

辨识单元	最大计算药量 q(t)	标准规定临界量 Q(t)	q/Q	是否构成重大危险源
5号爆竹成品仓库	9	50	$9/50=0.18<1$	否
6号烟花成品仓库	20	50	$20/50=0.4<1$	否
7号爆竹成品仓库	10	50	$10/50=0.2<1$	否
8号烟花成品仓库	20	50	$20/50=0.4<1$	否
9号烟花成品仓库	20	50	$20/50=0.4<1$	否
11号回收库	0.5	50	$0.5/50=0.01<1$	否

根据上表计算的结果可知：5号爆竹成品仓库、6号烟花成品仓库、7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库、9号烟花成品仓库、11号回收库均不构成烟花爆竹重大危险源。

但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际运行过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，制定事故应急救援预案并定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生燃烧、爆炸事故。

3.9 特殊危险化学品辨识

3.9.1 重点监管的危险化学品辨识

依据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）、《第二批重点监管危险化学品名录》（安监总管三〔2013〕12号），该项目未涉及重点监管的危险化学品。

3.9.2 剧毒化学品辨识

依据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部委公告〔2015〕第5号），该项目不涉及剧毒化学品。

3.9.3 高毒物品辨识

依据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号），该项目不涉及高毒物品。

3.9.4 监控化学品辨识

依据《各类监控化学品名录》（工信部令〔2020〕52号），该项目不涉及

监控化学品。

3.9.5 易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品的分类和品种目录》（2018年），该项目不涉及易制毒化学品。

3.9.6 易制爆危险化学品辨识

依据《易制爆危险化学品名录》（2017年，公安部），烟花爆竹的黑火药、烟火药中含易制爆危险化学品，如硝酸盐、高氯酸盐、硫磺、铝粉、铝镁粉等。

3.9.7 特别管控的危险化学品辨识

依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等公告[2020]第1号），该项目不涉及特别管控的危险化学品。

3.10 事故案例分析

1、贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂装载烟花时发生爆炸，2人死亡

事故经过：2003年8月2日12时10分，贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂在装载烟花爆竹过程中发生爆炸，造成2人死亡、4人受伤、10人轻伤。

事故原因：经调查组分析，是由野蛮装卸的撞击而引发了事故。

预防措施：加强安全管理，严格装卸、搬运、运输安全操作规程。

2、巴基斯坦一码头因烟头随手丢入爆竹中发生花炮爆炸，造成17人死亡

事故经过：2003年2月4日，巴基斯坦东部锡亚尔科特港一个装满烟花爆竹的集装箱突然起火爆炸，造成17人死亡，多人受伤。

事故原因：据当地警方介绍，当日下午工人在正在码头将准备运往拉合尔的花炮装入2个大集装箱，花炮突然起火引发连串爆炸。燃放的花炮蹦落到附近的屋顶及码头附近的学校内，引起火灾。爆炸共造成17人死亡，其中多数为码头工人，还有2名刚放学的小学生。花炮爆炸还造成20多人重

伤。爆炸原因是工人将烟头随手丢入爆竹中引起的。

预防措施:健全安全管理制度,制定教育培训计划,加强组织安全教育培训,增强员工安全意识,在码头装运烟花爆竹时,做好安全全警戒、防止非工作人员进入。

3、印度尼西亚公交车因发动机高温引发烟花爆炸, 10 人死亡

事故经过:2002年8月23日,印度尼西亚西瓜哇省一辆满载乘客的公交车发生烟花爆竹爆炸,造成公交车失火并爆炸,致使10人死亡、20多人受伤。

事故原因:当时车上共有60名乘客,1名乘客携带5大袋易燃易爆的烟花爆竹,上车后随手把包裹放到发动机上,结果发动机高温引燃了烟花,酿成悲剧。

预防措施:严禁携带烟花爆竹乘车,增强驾驶员安全意识。

4、直击雷烧毁成品库产品

事故经过:2002年9月,上栗县二出口花爆企业成品仓库在同一天下午,时间相差不到2个小时,两个花爆企业的成品仓库雷击引发了燃烧事故,其中也含部分B级罗马烛光(拉手)产品,但未引发爆炸,仓库所有产品燃烧殆尽,损失近100万元。

事故原因:成品仓库未安装避雷针,导致直击雷击中成品起火。B级罗马烛光(拉手)产品未引发爆炸,事后专家分析,是该产品新增加的铁丝网包装起了关键作用,从现场找到的罗马烛光(拉手)燃烧残留物分析,局部产生了高温点,坚固的发射筒扼致了药剂爆炸。

预防措施:雷电是自然界的一种静电现象,雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大,可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障,严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标,可遭受雷击事故,由于烟花爆竹易燃易爆,因此对整个库区均应设置防雷设施,建筑物防雷可使用避雷针,接地电阻应 $\leq 10\Omega$,定期检查测试,防止雷电危害。

5、静电引起燃烧烧毁成品库产品

事故经过:2004年11月,河南省某经营公司成品仓库在开箱验货时,将产品引燃,引发了燃烧事故,整幢仓库产品被烧毁。

事故原因:成品仓库门前未安装导静电设备,北方气候干燥,员工身上静电电压很高,验货开箱后,在接触产品时对产品产生了静电放电,静电火花导致成品起火。

预防措施:在烟花爆竹装卸作业中,如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装,会在作业人员身上积聚大量的静电电荷,产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时,就容易引起烟花爆竹的燃烧或爆炸,造成人员伤亡和财产损失。因此,作业人员进行作业时,均应穿戴防静电服装和导静电鞋,或在门口配置静电消除装置。严禁携带任何易燃物品。严格按操作规程操作。

6、车辆相撞发生烟花爆竹爆炸

事故经过:2007年9月15日,湖南省一辆满载烟花爆竹运输车在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸,造成10人死亡。

事故原因:湖南省安化县“9·15”特大烟花爆竹爆炸事故原因基本查明:因驾驶员疲劳驾驶在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸起火引燃整车烟花爆竹爆炸,造成10人死亡。

预防措施:严禁疲劳驾驶。

7、触电事故案例

事故经过:2003年2月1日上午广东省罗定市太平镇发生烟花爆炸事故,同时影响电力线路触电,导致7人死亡、21人受伤。

事故原因:据了解,当天上午1时40分左右,一名儿童在太平镇太平一桥处点燃刚买来的烟花玩耍,不小心将旁边的一片烟花摊档引燃,引发烟花爆炸。人群躲避将旁边的2辆摩托车挤倒,油箱中的汽油渗出,再次引发大火,大火将旁边密集电力线路烧断,导致过路人多人触电,共造成7人死亡,21人受伤。

预防措施:加强危险物品的库存管理,在事故现场及周边可波及范围内,紧急疏导群众撤离。在销售场所,烟花摊档摆设无药样品,有药产品放入专

用仓库。

8、江阴市南闸花炮厂仓库维修时发生爆炸

事故经过：1998年8月27日12时45分，江阴市南闸花炮厂仓库维修时发生爆炸，造成一人死亡，一人重伤。

事故原因：维修人员在维修仓库屋面时吸烟，不小心将烟头丢入仓库内导致烟花爆竹燃烧爆炸，维修人员受惊从屋面跌落，造成一人死亡，一人重伤。

预防措施：仓库维修前应对维修人员进行安全培训教育，安全员应跟班作业。

9、中毒窒息事故案例

事故经过：1993年12月28日，广西合浦县公馆炮竹厂第一生产区烟花一车间发生爆炸事故。死1人，伤1人，引起周围工房殉爆，伤5人，2人休克。

事故原因：该起爆炸事故中，1人死亡原因是爆炸冲击波，受伤人员原因有冲击波致伤、有爆炸抛撒物砸伤，还有多人是在车间内由于烟花爆竹燃烧爆炸产生大量含硫烟雾，且爆炸使工房倒塌封堵逃生路口，致使狭窄空间内充满大量有毒烟雾，致使在事故现场的多人由于中毒和窒息而受伤。

预防措施：作业场所内保持足够的疏散通道并保持良好的通风状态。

4 评价单元的划分及评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

4.1.1 评价单元划分原则

划分评价单元的目的在于确定评价方法和实现评价目标服务。正确划分评价单元有利于评价工作的顺利进行，提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点、特征与危险和有害因素的类别、分布有机结合进行划分。还可以按评价的需要将一个评价单元划分为若干个子评价单元或更小的单元。

单元是仓库的相对独立的组成部分，具有布置上的相对独立性或不同性。本次验收评价即是在这一原则基础上，同时考虑烟花爆竹仓库的特点以及各部分的主要危险、有害因素及其危险程度、事故范围来划分验收评价单元的。

4.1.2 评价单元的划分

根据烟花爆竹库房的特点，结合本次评价工作的需要，分为以下 9 个单元：

- 1、安全生产基本资料审核单元；
- 2、总体布局、条件和设施单元；
- 3、安全防护设施、措施单元；
- 4、周边环境危险性单元；
- 5、重大危险源单元；
- 6、现场检查单元；
- 7、储存运输作业单元；
- 8、重大事故隐患判定单元；
- 9、建设项目安全“三同时”检查单元。

4.2 评价方法的选择

按照《烟花爆竹企业安全评价规范》关于评价单元划分的要求，本次对

上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目进行安全验收评价，总体风险上采用安全检查表分析法和作业条件危险性分析法进行评价。

根据各单元装置和任务特性，结合评价方法的适宜性，确定了各单元的评价方法。见表 4.2-1。

表 4.2-1 评价单元划分表

序号	单元名称	评价方法
1	安全生产基本资料审核单元	安全检查表分析法
2	总体布局、条件和设施单元	安全检查表分析法
3	安全防护设施、措施单元	安全检查表分析法
4	周边环境危险性单元	安全检查表分析法
5	重大危险源单元	安全检查表分析法
6	现场检查单元	安全检查表分析法
7	储存运输作业单元	作业条件危险性分析法
8	重大事故隐患判定单元	安全检查表分析法
9	建设项目安全“三同时”检查单元	安全检查表分析法

4.3 评价方法简介

4.3.1 安全检查表分析法

安全检查表法（简称 SCL）针对被评价单位存在的固有危险和有害因素，依据国家相关标准、规程、规范及规定，通过对检查表中的各项目及内容进行检查，查找出系统中各种潜在的事故隐患。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表的编制中，应明确检查对象，明确所要遵循的标准、规范，具体剖析并细分检查对象，根据不同的检查阶段及要求选择适宜的检查表类型。由于其种类多，可适用于各个阶段、各个不同用途的检查要求，因此是应用极为广泛的一种安全评价方法。

使用安全检查表可发现工程系统的自然环境、地理位置条件、现场环境

以及设计中工艺、设备本身存在的缺陷，防护装置的缺陷，保护器具和个体防护用品的缺陷经及安全管理等诸多方面的潜在危险因素，从而找出所造成的不安全行为与不安全状态，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。运用安全检查表进行日常检查，是安全分析结果的具体落实，是预防工程潜在危险、危害事故发生的有效工具。

4.3.2 作业条件危险性分析法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：

- 1、事故发生的可能性（L）；
- 2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）；
- 3、一旦发生事故可能造成的后果（C）。

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以这三个因素分值的乘积 $D=L \cdot E \cdot C$ 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作业条件危险性也越大，即劳动安全风险愈大。

1、赋分标准

1) 事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的概率为 1，规定对应的分值为 10；绝对不发生的事实的概率为 0，而生产作业中不存在绝对不发生事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为 0.1；以此为基础规定其它情况相对应的分值，见表 4.3-1：

表 4.3-1 事故发生可能性分值（L）

序号	分数值	事故发生可能性	备注
1	10	完全会被预料到	
2	6	相当可能	
3	3	可能，但不经常	
4	1	完全意外，很少可能	

序号	分数值	事故发生可能性	备注
5	0.5	可以设想，但不可能	
6	0.2	极不可能	
7	0.1	实际上不可能	

2) 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

人员暴露在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为 10，最小的分值为 0.5，分值 0 表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。

暴露于危险环境的频繁程度分值 (E)，见表 4.3-2:

表 4.3-2 暴露于危险环境的频繁程度分值

序号	分数值	暴露于危险环境的频繁程度	备注
1	10	连续暴露	
2	6	每天工作时间内暴露	
3	3	每周一次或偶然暴露	
4	2	每月暴露一次	
5	1	每年几次暴露	
6	0.5	非常罕见的暴露	

3) 发生事故可能造成的后果 (C)

由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为 1，许多人同时死亡对应的分值为 100，其它情况打分标准见表 4.3-3，并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。

表 4.3-3 事故造成的后果分值

序号	分数值	事故造成的后果	备注
1	100	大灾难，十人以上死亡，或造成重大财产损失	
2	40	灾难，数人死亡，或造成很大财产损失	
3	15	非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失	
4	7	严重，伤残或较小的财产损失	
5	3	重大，致残，或很小的财产损失	
6	1	引人注目，不利于基本的安全卫生要求	

2、劳动安全风险分级划分标准

根据安全生产管理的经验，危险性分数值在 20 以下的环境被认为是比较安全的，是低危险性的，这种危险性比日常人们骑自行车上班发生的危险性还小。危险性分数值达 70~160，就是显著危险性，需及时整改。危险性分数值达 161~320 的作业环境是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境，危险分数值达 320 分以上高分时，表示作业环境的安全性非常危险，应立即停产整顿，直到作业环境得到改善，危险性已经消除后，方可恢复生产，危险性的分级分数值如表 4.3-4。

表 4.3-4 危险性分数分级 (L×E×C)

序号	危险性程度	分数值
1	极其危险，应立即停产整改	>320
2	高度危险，应立即整改	161-320
3	很危险，应及时整改	70-160
4	可能产生危险，需注意安全	20-69
5	稍有危险，提高警惕	<20

5 定性、定量评价

5.1 资料审核单元安全评价

本项目资料审核单元安全评价结果见表 5.1-1。

表 5.1-1 资料审核单元表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	企业营业执照详见附件。	符合
		安全生产组织机构	企业成立安全领导小组。	符合
		产品质量检测检验管理机构	企业成立产品质量检测检验管理机构。	符合
		保卫组织机构	企业已成立保卫组织机构。	符合
		应急救援组织	企业已成立应急救援组织机构。	符合
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证明	主要负责人、安全管理人员均取得证书。	符合
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	经相关部门培训考核合格,取得上岗资格证明。	符合
		驾驶、押运人员资格证明	有驾驶员、押运员资格证明。	符合
		其他从业人员培训上岗资格证明	企业其他从业人员经企业培训,取得上岗资格证。	符合
		从业员工工伤保险名单	企业为员工购买了工伤保险及安全生产责任保险,详见附件。	符合
3	规章制度	安全生产责任制度	企业主要涉及烟花爆竹成品的储存,不涉及生产工艺,企业制定了相应的安全生产责任制度。	符合
		安全管理责任制度	企业制定了安全管理责任制定。	符合
		识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度	企业制定了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度。	符合
		管理制度评审和修订制度	企业制定了管理制度评审和修订制度。	符合
		安全教育培训与持证上岗制度	企业制定了安全教育培训与持证上岗制度。	符合
		安全投入保障及安全生产费用提取和使用制度	企业制定了安全投入保障及安全生产费用提取和使用制度。	符合

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
		隐患排查整改制度	企业制定了隐患排查整改制度。	符合
		危险作业审批管理制度	企业制定了危险作业审批管理制度。	符合
		动火作业管理制度	企业制定了动火作业管理制度。	符合
		安全生产会议管理制度	企业制定了安全生产会议管理制度。	符合
		产品入库检验和验收制度	企业制定了产品入库检验和验收制度。	符合
		仓库安全管理及保管守卫制度	企业制定了仓库安全管理及保管守卫制度。	符合
		烟花爆竹安全管理制度	企业制定了烟花爆竹安全管理制度。	符合
		劳动防护用具（品）配备和使用管理制度	企业制定了劳动防护用具（品）配备和使用管理制度。	符合
		产品流向登记管理制度	企业制定了产品流向登记管理制度。	符合
		重大危险源评估与监控措施	企业烟花爆竹储存库区各储存单元不构成重大危险源。	不涉及
		职工及外来人员、车辆出入库区登记制度	企业制定了职工及外来人员、车辆出入库区登记制度。	符合
		事故应急救援、演练管理制度	企业制定了事故应急救援、演练管理制度。	符合
		事故应急救援预案	企业制定了生产安全事故应急预案,并经上饶市应急管理局备案。	符合
		事故报告与处理管理制度	企业制定了事故报告与处理管理制度。	符合
		配电室安全管理制度	企业制定了配电室安全管理制度。	符合
		关键装置、重点部位安全管理制度	企业制定了关键装置、重点部位安全管理制度。	符合
		安全检查制度	企业制定了安全检查制度。	符合
		安全设施设备管理制度	企业制定了安全设施设备管理制度。	符合
		企业负责人现场带班管理制度	企业制定了企业负责人现场带班管理制度。	符合
		安全目标管理与奖惩及违规违章作业处理制度	企业制定了安全目标管理与奖惩及违规违章作业处理制度。	符合
		绩效考核管理制度	企业制定了绩效考核管理制度。	符合
		风险评价制度	企业制定了风险评价制度。	符合
		职业危害防治管理制度	企业制定了职业危害防治管理制度。	符合
		上下班考勤管理制度	企业制定了上下班考勤管理制度	符合
		不合格产品处置制度	企业制定了不合格产品处置制度。	符合

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
		安全操作规程	企业制定了安全操作规程。	符合
		其他相关资料	企业制定了买卖合同管理制度、防火防爆管理制度、安全标准化自评管理制度等。	符合
4	技术资料	设计说明书	企业委托山东鸿运工程设计有限公司编制安全设施设计，有相关的设计材料。	符合
		平面布局图	企业委托设计单位已编制总平面布置图。	符合
		库房施工设计图	企业委托设计单位已编制施工设计图纸，详见附件。	符合
		安全设施和设备清单	企业制定安全设施和设备清单，库区防雷经吉林华云气象科技有限公司检测合格、防静电经国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测宜春站检测合格。	符合
		消防设施和设备清单	企业制定消防设施和设备清单。	符合
		主要生产设施和设备检测合格证明	企业主要涉及烟花爆竹成品的储存，不涉及生产工艺，无生产设备。	不涉及
		特种设备检测合格证明	企业烟花爆竹储存不涉及特种设备。	不涉及
		配送运输车辆情况	企业烟花爆竹委托有烟花爆竹运输资质单位运输。	符合
资料审查结论意见			符合安全条件。	

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.2 总体布局、条件和设施评价

本项目选址与总平面布置见表 5.2-1、总布局、条件和设施现场检查见表 5.2-2。

表 5.2-1 选址与总平面布置检查表

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	选址与总平面布置	烟花爆竹批发仓库的库址应按流向合理、集散便利的原则，并综合考虑建库的经济效益和社会效益进行选择。库址应符合当地土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，因地制宜，合理布局，提高土地利用率。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标	库址按流向合理、集散便利原则，库址符合当地土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，因地制宜，合理布局，提高土地利用率	符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		125-2009) 第九条		
2		库址应具有良好的地形、工程地质等条件,建设地区应具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源,以及交通运输、通讯等外部协作条件。《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标 125-2009) 第十条	库址具有良好的地形、工程地质等条件,建设地区具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源,以及交通运输、通讯等外部协作条件。	符合
3		库址应位于不受洪水或内涝威胁地区,当不可避免时,必须采取可靠的防洪、排涝措施,库址防洪标准可按 50 年一遇考虑。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标 125-2009) 第十一条	库址位于不受洪水或内涝威胁地区	符合
4		下列地区不应选为库址: 一、地震烈度大于 9 度的地区。 二、存在地质危害的地段,如泥石流、滑坡、流沙等。 三、历史文物古迹保护区。 四、工程土质不良地区,如 IV 级自重湿陷性黄土,厚度大的新近堆积黄土,高压缩性的饱和黄土和 III 级膨胀土等。 五、具有开采价值的矿藏区。 六、雷暴区。 《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标 125-2009) 第十二条	库址不在左述地区	符合
5		库址应远离污染源及其他易燃易爆危险场所,且应位于污染源全年最小频率风向的下风侧。《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标 125-2009) 第十三条	库址远离污染源及其他易燃易爆危险场所,且位于污染源全年最小频率风向的下风侧。	符合
6		烟花爆竹批发仓库总平面布置、外部最小允许距离和内部最小允许距离应符合下列要求: 一、总平面布置应根据库址地形、工程地质、气象、水文、库房危险等级和计算药量、运输方式、库区外交通和安全条件等综	1、总平面布置根据库址地形、工程地质、气象、水文、库房危险等级和计算药量、运输方式、库区外交通和安全条件等综	符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		<p>合考虑，分别设置库区、生产辅助区和办公服务区。做到分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理。无关人流和货流不应穿越库区，产品运输不宜穿越办公服务区。</p> <p>二、比较危险的或计算药量较大的库房不宜布置在库区出入口附近。库房不宜长面相对布置。运输产品车辆不应在其他防护屏障内穿越通过。</p> <p>三、库区应设置高度不低于 2m 的密砌围墙，在特殊地段设置有困难时，可局部设置刺网围墙；围墙与库房距离不应小于 5m。</p> <p>四、独栋 1.3 级库房计算药量不宜超过 20000kg，独栋 1.1²级库房计算药量不宜超过 10000kg。库房外部最小允许距离和内部最小允许距离应按现行国家标准执行。划定的库房外部最小允许距离范围内不得进行相应的工程建设。</p> <p>五、1.1²级库房应设置防护屏障，防护屏障应按现行国家标准执行。</p> <p>六、库区内汽车运输主干道纵坡不宜大于 6%；山区受限区域，不应大于 8%。手推车和装运机械运输主干道纵坡不宜大于 2%。</p> <p>《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）第十五条</p>	<p>生产辅助区和办公服务区。做到分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理；</p> <p>2、库区四周设置的密砌围墙将库区与外界隔开，围墙与仓库距离不小于 5m。</p> <p>3、库区设置了 6 栋 1.3 级烟花爆竹仓库，内外部距离均符合标准要求；</p> <p>4、库区内汽车运输主干道纵坡不大于 8%。</p>	
选址及总平面布置现场检查意见			符合安全条件。	

表 5.2-2 总体布局和条件设施现场检查表

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	总体布局	围墙	库区四周设置了密砌围墙将库区与外界隔开，围墙与仓库距离不小于 5m。	符合
		功能分区	企业烟花爆竹储存库区分为办公生活区、值班监控区和储存区，功能分区明确。	符合
		建筑物危险等级划分和	6 栋烟花爆竹仓库危险等级均为 1.3 级，分	符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
		布置	开布置。	
		危险品运输通道	企业烟花爆竹储存库区的运输通道完善，间距符合要求。	符合
		值班室	企业烟花爆竹储存库区设置了值班室，值班室与各烟花爆竹仓库间距满足标准要求。	符合
		外部安全距离	企业烟花爆竹储存库区与外部建筑、设施的间距满足标准要求，详见表 5.4-1。	符合
		安全疏散条件	企业烟花爆竹储存库区设置了 2 个安全出口；5 号、7 号爆竹成品仓库设置 3 个安全出口；6 号、9 号烟花成品仓库设置 6 个安全出口仓库中间设置有防火墙，将其分为 2 个防火分区，每个分区设有 3 个安全出口，8 号烟花成品仓库设置 4 个安全出口；11 号回收库设置 2 个安全出口；各仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15m，安全疏散条件满足标准要求。	符合
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度、建筑物之间的通道宽度	烟花爆竹储存库区主要道路宽度为 4.5 米，坡度不大于 8%。	符合
		消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间	库区利用南面湛家水库为消防蓄水池，消防蓄水池容量大于 1000m ³ ，并配备消防泵 2 台（一用一备），消防蓄水池的水量及补水量满足消防用水需求，水压满足要求，消防水池的保护范围包括整个储存库区。	符合
		安全监控保卫设施和固定值班电话	各仓库安装视频监控摄像头，视频监控信号传输至库区监控室。	符合
总体布局和条件设施现场检查结论意见			符合安全条件。	

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.3 安全防护设施、措施评价

库区安全防护设施包括消防设施、防雷防静电设施、视频监控系统、防盗报警设施、安全警示标志等，评价过程见下表 5.3-1。

表 5.3-1 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	库区利用南面湛家水库为消防蓄水池，消防蓄水池容量大于 1000m ³ 、配备了消防水泵，消防水源充足，仓库配备了灭火器。	符合
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区防雷设施设置符合要求，经防雷检测公司检测合格	符合
3	防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区设置视频监控系统，终端设在门卫室，监控设施配备 UPS 备用电源。	符合
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	库房内不安装照明设施，库区内暂未设置照明设施	符合
5	其它安全设施	库区设置安全警示标志及限速标志。库区未设置“一图一牌三清单”。	不符合
安全设施现场检查意见		有 1 项不符合安全条件。	

检查结果：库区未设置“一图一牌三清单”，经整改符合要求。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.4 周边环境危险性评价

本项目新建烟花爆竹仓库位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，地形为山地，地貌相对简单。周边环境详见下表 5.4-1。

表 5.4-1 周边环境距离明细表

方位	库房编号及用途	危险等级	药物限量(kg)	周边毗邻情况	实际距离(m)	标准距离(m)	符合性
东面	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	外部环境 100m 范围内为农田，无其它安全影响设施	大于 100	65	合格
南面	8号烟花成品仓库	1.3	20000	湛家村（50人以上）	175	140	合格
	9号烟花成品仓库	1.3	20000	湛家村（50人以上）	189	140	合格
西面	9号烟花成品仓库	1.3	20000	原花炮企业（已退出）闲置房	87	85	合格
北面	11号回收库	1.3	500	外部环境 200m 范围内为山地，无其它安全影响设施	大于 200	35	合格

方位	库房编号及用途	危险等级	药物限量(kg)	周边毗邻情况	实际距离(m)	标准距离(m)	符合性
东北面	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	庙(50人以下,非常住)	78	65	合格
	6号烟花成品仓库	1.3	20000		89	85	合格
	5号爆竹成品仓库	1.3	9000	李家(50人以上)	105	105	合格
	6号烟花成品仓库	1.3	20000		148	140	合格

本项目周边无重要公用设施、风景区及水库等,与周边建筑物距离能够满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)及《公路安全保护条例》第十八条规范要求,库区四周无重要建筑物、保护区域等。

单元评价结论:具备安全验收条件。

5.5 重大危险源评价

该公司5号爆竹成品仓库、6号烟花成品仓库、7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库、9号烟花成品仓库、11号回收库均不构成烟花爆竹重大危险源。

5.6 现场检查情况

本项目5号爆竹成品仓库、6号烟花成品仓库、7号爆竹成品仓库、8号烟花成品仓库、9号烟花成品仓库、11号回收库现场检查情况见下表5.6-1。

表 5.6-1 现场检查表

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
1	定级定量	建筑物危险等级	建筑物危险等级为1.3级。	符合
		核定存药量	5号爆竹成品仓库核定存药量9000kg、6号烟花成品仓库核定存药量20000kg、7号爆竹成品仓库核定存药量10000kg、8号烟花成品仓库核定存药量20000kg、9号烟花成品仓库核定存药量20000kg、11号回收库核定存药量500kg	符合
		内部安全距离	内部安全距离符合要求	符合
		安全标识标志	部分仓库安全要素牌与设计图纸不一致,未	不符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
			明确责任人。	
2	建筑结构	建筑设计防火和结构	烟花爆竹仓库均采用砖混结构，墙体采用24cm砖墙，屋面采用钢梁彩钢瓦结构。	符合
		建筑物防火等级	烟花爆竹仓库的耐火等级均为二级。	符合
		门的开启方向、宽度、数量以及其他建筑物门的对应方向等	5号、7号爆竹成品仓库设置3个安全出口；6号、9号烟花成品仓库设置6个安全出口仓库中间设置有防火墙，将其分为2个防火分区，每个分区设有3个安全出口，8号烟花成品仓库设置4个安全出口；11号回收库设置2个安全出口；各仓库内任一点至安全出口的距离均小于15m。	符合
		窗的结构、材料及开启方向	烟花爆竹仓库窗采用高位通风窗及勒角处设有低位通风窗。	符合
		屋盖的材料、结构	烟花爆竹仓库屋面均采用钢梁彩钢瓦结构。	符合
		墙的结构、厚度、内墙面、梁或过梁的设置等	烟花爆竹仓库均采用砖混结构，墙体采用24cm砖墙。	符合
		地面阻燃性、柔性、导电性能	烟花爆竹仓库地面均采用普通水泥地面。	符合
		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	烟花爆竹仓库地面进行防潮处理；仓库隔热效果良好；设置窗户进行自然通风；窗户设置有防小动物的防护网。	符合
3	疏散要求	安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离	5号、7号爆竹成品仓库设置3个安全出口；6号、9号烟花成品仓库设置6个安全出口仓库中间设置有防火墙，将其分为2个防火分区，每个分区设有3个安全出口，8号烟花成品仓库设置4个安全出口；11号回收库设置2个安全出口；各仓库内任一点至安全出口的距离均小于15m，库房安全疏散条件满足标准要求。	符合
		建筑物内的通道宽度	烟花爆竹仓库库内通道宽度1.5米。	符合
		门口的台阶及坡度	烟花爆竹仓库门口不设台阶。	符合
4	人员	核定数量	库房定员8人。	符合
		培训和上岗证	主要负责人、专职安全员、特种作业人员、危货运输驾驶员和押运员均经过相应培训	符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
			并取得安全资格证书。	
		衣着	员工衣着为棉制品。	符合
		防护用品及材质	企业为员工统一劳动防护服、防护鞋、防护手套等，防护服及防护手套采用棉质。	符合
		年龄和身体状况	企业员工身体状况良好。	符合
5	防护屏障	防护屏障设立	烟花爆竹仓库危险等级均为 1.3 级，可不设置防护屏障。	符合
		防护屏障的形式和防护能力	可不设置防护屏障。	不涉及
6	消防	设施、器材的配置和检验	仓库门口配备灭火器。	符合
		防火设备和措施	配备了消防蓄水池、消防泵、消火栓及水带水枪等	符合
		电气设备的选型与安装	室内未安装设置电气设备，视频监控线路均穿管敷设。	符合
		电气照明的选型与安装	仓库室内不安装电气照明设施。	不涉及
		电线的选型、连接、敷设	仓库外墙信号线穿管敷设。	符合
		建筑物的防雷	仓库设置了防雷设施，已经检测合格，符合标准要求；	符合
		设备和电气的接地	库房未采用电气设备；	符合
		设备的检修和维护	库房未采用电气设备；	符合
		消除人体静电装置	成品库入口处设置有消除人体静电装置。	符合
7	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	部分仓库堆码线不符合规范要求。	不符合
		运输通道的宽度	部分仓库堆码线不符合规范要求。	不符合
		库房地面防潮措施	仓库地面进行了防潮处理。	符合
		库房内湿度、温度、通风的控制	仓库内设置温湿度计及记录本，用于监测仓库内温度和湿度；仓库墙面设置通风窗，库内主要采用自然通风。11 号回收库通风窗未设置丝网。	不符合
		机动车库区行驶路线和装卸	库区机动车行驶路线独立设置；装卸过程中，车辆配备防火罩。	符合
8	制度	岗位安全管理制度	企业已制定了各岗位安全管理制度。	符合

序号	项目	检查项目	实际情况	检查结论
	规程	岗位安全操作规程	企业已制定了各岗位安全操作规程。	符合
仓库现场检查结论意见			有 4 项不符合安全条件。	

检查结果：部分仓库安全要素牌与设计图纸不一致，未明确责任人；部分仓库堆码线不符合规范要求；11 号回收库通风窗未设置丝网；经整改符合要求。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.7 储存运输作业单元评价

本次评价中对储运过程事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险作业环境的频繁程度（E）、发生事故可能造成的后果（C）等三种因素赋值及其取值是根据烟花爆竹行业内同类库区储运作业过程已知的燃烧爆炸的危险因素、已发生事故后果和该仓库区的现场实际情况确定的，具体评价结果见表 5.7-1、5.7-2。

表 5.7-1 作业条件危险性评价表

作业活动	危险因素	可能导致后果	L	E	C	D	级别
仓储过程	库内产品堆码违反定置规定，库内通风不畅而温度过高或湿度过大。	火灾、爆炸	1	3	40	120	III
	违反同库存放原则，废品及互相抵触的危险品同库存放。	火灾、爆炸	1	3	40	120	III
	存放非法生产或来历不明的产品。	火灾、爆炸	3	2	40	240	II
	库房管理不善，漏雨、水浸、机械损伤等导致包装箱破损、泄漏，产品受潮。	性能失效或导致自燃	1	1	40	40	IV
	雷雨等恶劣天气，受到雷击，或人员受天气影响出现操作失误。	火灾、爆炸	1	2	40	80	III
	超量储存。	事故扩大	3	2	40	240	II
	消防设施失效，造成初期火灾等险情未得到及时控制。	火灾、爆炸	3	1	40	120	III
	库区外部山火由于得不到有效的阻挡而蔓延至库房。	火灾、爆炸	1	6	40	240	III

作业活动	危险因素	可能导致后果	L	E	C	D	级别
	违反禁火规定，带火种或其它易燃易爆物资、危险化学品进入库区。库区内动火动焊安全保证措施不完善。	火灾、爆炸	1	2	40	80	III
	违反堆放规定，产品堆放过高，造成产品坍塌。	坍塌	1	0.5	1	0.5	V
运输装卸过程	违反装卸搬运操作规定，未执行轻拿、轻放、稳步慢行规定，野蛮作业，使危险品受到强烈震动、撞击或摩擦。	火灾、爆炸	1	2	40	80	III
	搬运路线有沟坎，台阶，或库内地面不平整，导致装卸过程操作人员摔、跌等，造成产品因为坠落而受到强烈撞击或摩擦。	火灾、爆炸	0.5	2	40	40	IV
	无排气管火花熄灭装置的车辆运输危险品，导致产品长期受热。	火灾、爆炸	0.5	6	15	45	IV
	车辆电路、油路故障引发车辆火灾，导致产品受到高温烘烤或着火。	火灾、爆炸	1	3	40	120	III
	车辆碰撞、车辆倾覆等交通事故引发火灾，导致产品受到高温烘烤或着火。	火灾、爆炸	1	3	40	120	III
	道路不平整、坡度过大，车辆颠簸，产品受到强烈震动、挤压。	火灾、爆炸	0.5	6	15	90	IV
	进入库区，车辆不按限速标志行驶；车辆失控；道路不平整，坡度过大。车辆撞到工作人员或其它人员。	车辆伤害	1	1	7	7	V

表 5.7-2 作业条件评价小结

作业条件	作业危险统计				
	极度危险 I	高度危险 II	显著危险 III	一般危险 IV	稍有危险 V
仓储过程	0	2	6	1	1
运输装卸过程	0	0	3	3	1
合计	0	2	9	4	2

通过对单元进行作业条件分析评价可知，仓储过程有两项危险因素高度危险，应制定严格的管理制度，要求员工按章操作，严禁超量存放，并且在库区围墙外设置防火隔离带，防止库外发生山火时蔓延至库内。

5.8 重大事故隐患判定

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表 5.8-1。

表 5.8-1 重大事故隐患判定检查表

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	企业主要负责人和安全管理人員已培训考核合格，取得上岗资格证书。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检修设备设施。	特种作业人员已培训考核合格，取得上岗资格证书。	符合要求
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	无此项	无此项
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	工（库）房作业人员数量已按核定人数定员。	符合要求
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	工（库）房存储药量按核定药量存放。	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	工（库）房内、外部安全距离符合要求，1.3 级仓库可不设防护屏障。	符合要求
7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防火、防雷设备设施已安装。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	库区四周设置了密砌围墙库区与外界隔开，围墙与仓库距离不小于 5m。	符合要求
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房內粉碎、称量。	无此项	无此项
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	无此项	无此项
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	无此项	无此项
13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或	建立了与岗位相匹配的全员安	符合要求

序号	检查项目	实际情况	检查结果
	者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	存放的产品种类、危险等级按许可范围经营。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	无此项	无此项
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	无此项	无此项
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	无此项	无此项
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	无此项	无此项

检查结果：该项目不涉及条重大隐患内的内容。

5.9 建设项目安全“三同时”检查单元评价

5.9.1 建设项目“三同时”检查

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”等国家法规要求，我单位对上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全设施进行检查，确认其安全设施：消防水池、消防泵、避雷设施、人体静电消除装置、视频监控系统等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

5.9.2 建设项目对《安全预评价报告》中安全对策措施的落实情况

该项目委托江西省赣华安全科技有限公司出具《安全预评价报告》，《安全设施设计》均已采纳《安全预评价报告》安全对策措施。

5.9.3 建设项目对《安全设施设计》中安全对策措施的落实情况

该项目委托山东鸿运工程设计有限公司出具《安全设施设计》，并经上

饶市应急管理局审查通过，竣工后于 2023 年 10 月出具《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司总平面布置图》，本报告对照《安全设计设施》制定检查表，对该公司 5 号爆竹成品仓库、6 号烟花成品仓库、7 号爆竹成品仓库、8 号烟花成品仓库、9 号烟花成品仓库、11 号回收库“三同时”落实情况进行安全检查，具体见表 5.9-1。

表 5.9-1 《安全设施设计》中主要对策措施落实情况检查表

序号	《安全设施设计专篇》的对策措施	落实完成情况	结论
一、建筑结构的对策措施及建议			
1	240mm 实心墙，宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构	改建的 7、8、11 号仓库建筑结构为砖混结构，实心墙厚 24cm。新建的 5、6、9 号仓库建筑结构均为砖混结构，实心墙厚 24cm。	符合要求
2	宜采用轻质泄压或轻质易碎屋盖，或现浇钢筋混凝土屋盖	钢梁彩钢瓦屋盖	符合要求
3	二级耐火	二级耐火等级	符合要求
4	门应向外平开，门洞的宽度不宜小于 1.5m，不得设门槛；宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启；	门向外平开，门洞的宽度不小于 1.5m，不设门槛；门为单层均向外开启。	符合要求
5	不少于 1 个（按单个防火分区计算）	5 号爆竹成品仓库设 3 个安全出口、6 号烟花成品仓库设 6 个安全出口、7 号爆竹成品仓库设 3 个安全出口，8 号烟花成品仓库设置 4 个安全出口，9 号烟花成品仓库设 6 个安全出口，11 号回收库设 2 个安全出口。	符合要求
6	仓库内任一点至安全出口的距离不应大于 15m	不大于 15m。	符合要求
7	有防潮措施	采用防潮地面。	符合要求
8	有隔热措施	彩钢瓦屋面下设隔热层。	符合要求
9	有通风措施	仓库前后上下要求对开通风窗。	符合要求
10	窗应有防小动物进入的措施	通风用窗安装纱窗防小动物进入。11# 回收库通风窗未设置丝网。	不符合要求

序号	《安全设施设计专篇》的对策措施	落实完成情况	结论
11	当危险品已装箱并不在库内开箱时,可采用一般地面	11号回收库中有散装烟花爆竹成品堆放,地面铺设导静电板。	符合要求
二、运输和配送能力对策措施及建议			
1	库区内危险品的运输,应采用带有防火罩的汽车运输。不宜采用三轮车,严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。进入库房区的机动车辆,排气管必须有阻火装置;	暂未经营,后期严格执行。入库委托有烟花爆竹运输资质的单位进行运输。出库配备危险货物运输车辆1辆:赣C2M987,并配有驾驶员、押运员,均取得资质证书。	符合要求
2	库区外应按《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618-2004)等进行烟花爆竹的运输。	委托有资质的运输单位进行运输。	符合要求
3	危险品仓库区内汽车运输危险品的主干道纵坡不大于8%。库区运输危险品的主干道中心线,与库房距离不小于10m。	库区内汽车运输危险品的主干道纵坡不大于8%。库区运输危险品的主干道中心线,与库房距离大于10m。	符合要求
三、防雷与人体静电释放对策措施及建议			
1	该公司烟花爆竹仓库防雷为二类防雷,二类防雷建筑采用独立接闪杆和架空接闪线防直击雷。建筑物内设备、管道、构架等主要金属物就近接到防闪电感应接地装置上,防雷电感应接地、防静电接地、防雷电波侵入接地共用一套接地装置,该接地系统的接地电阻不大于10Ω。	防雷形式采用独立接闪杆和架空接闪线。每个仓库的入口处外墙外侧设置静电触摸释放球消除人体静电,接地电阻不大于100Ω。	符合要求
四、消防设施对策措施及建议			
1	可采用室外消火栓、固定式消防泵等不同类型的给水系统	采用XBD5.0/30G-L消防泵,室外消火栓SS100/65-1.6。	符合要求
2	必须充足可靠。当利用天然水源时,在枯水期应有可靠的取水设施;当采用自备水源井时,应设置消防蓄水设施	消防水源为库区南侧长年不干涸的湛家水库,利用库区消防水泵抽水。	符合要求
3	消防用水量按25L/s计算,消防延续时间按3h计算,不少于270t	天然水池大于1000m ³ ,消防管网采用DN100水管。	符合要求
4	应设有固定式消防泵或手抬机动消防	有2台专用消防水泵,一备一用,消	符合要求

序号	《安全设施设计专篇》的对策措施	落实完成情况	结论
	泵；消防泵宜设有备用泵。	防水泵选用固定式消防泵（同步排吸）（水泵功率：22kw, 流量：30L/s, 压力：0.5MPa）。保护半径为150m。	
5	消防储备水应有平时不被动用的措施。使用后的补给恢复时间不宜超过48h	消防储备水在平常消防演练后及时进行补充，补给恢复时间短。	符合要求
6	烟花爆竹生产项目和经营批发仓库宜按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定配置灭火器	5号配备4具、6号成品仓库配备8具，7号成品仓库配备4具，8号、9号成品仓库均配备8具，11号回收库配备2具MFZ/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。4号监控室配备2具气体灭火器、3号值班室配备2具MFZ/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	符合要求
五、通讯、视频监控系统、安全防范工程、监控室等对策措施及建议			
1	危险品库区和危险品总仓库区应设置畅通的固定电话	安装固定电话。	符合要求
2	危险品总仓库区宜设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定	每个仓库和主要出入口按相关规范的规定安装数字彩色枪型视频监控系统。摄像头和线路均在危险区域之外。	符合要求
3	烟花爆竹总仓库区及仓库的安全防范措施应采用“人防、物防、技防”相结合的方式；烟花爆竹的危险品仓库及库区宜设置安全防范系统	采取“值班安全员、视频监控系统”相结合的方式安全防范。	符合要求
4	烟花爆竹生产项目和经营批发仓库的消防控制室、安全防范系统监控中心及自动控制室宜设置在单独建筑物内，亦可附建在非危险性建筑物内	设有4号监控室。	符合要求
5	危险品库区和危险品总仓库区可设置火灾自动报警系统；当危险品库区和危险品总仓库区不设置火灾自动报警系统时，可采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置。	值班室配置畅通的报警电话。	符合要求
六、应补充安全管理方面的对策措施			
1	建立健全安全生产责任制和各岗位安	已建立健全。	符合要求

序号	《安全设施设计专篇》的对策措施	落实完成情况	结论
	全操作规程		
2	加强各级人员的安全教育和培训，员工上岗前应进行“三级教育”；	企业主要负责人和安全管理人員已培训考核合格，持证上岗。	符合要求
3	特种作业人员应持证上岗	特种作业人员已培训考核合格，持证上岗。	符合要求
4	加强安全生产检查，督促职工按照安全操作规程进行库房管理、车辆管理、检验验收和装卸作业，防止安全事故发生，对安全检查记录应存档。仓库值班人员应 24 小时坚守岗位，对进库人员随身携带的香烟、打火机应收留，对穿戴化纤衣物的人员应禁止入库或提供防静电服装。	暂未经营，后期严格执行。	符合要求
七、其它方面提出的对策措施			
1	建立义务消防队伍，定期进行消防演习；仓库应明确 1 名消防设施安全管理人员，全面负责仓库消防设施、器材管理，确保完好有效，对消防泵应定期启动检查，保留检查记录。	暂未经营，后期严格执行。	符合要求
2	该库区建在山坡上，库区的汽车运输主干道纵坡不宜大于 6%	汽车运输主干道纵坡小于 6%。	符合要求
3	建议在库区内外修葺截排水沟，防止暴雨季节，山水冲毁库区建筑物，从而引发安全事故；	库区内外修葺截排水沟。	符合要求
4	库区内不得设置锅炉、煤炉等明火取暖、做饭设施；	库区内未设置锅炉、煤炉等明火取暖、做饭设施。	符合要求
5	仓库建成后成箱成品堆垛的高度不应超过 2.5m，堆垛之间的距离不宜小于 0.7m，堆垛距内墙的距离不宜少于 0.45m，搬运通道的宽度不宜小于 1.5m，并在墙面及地面做出相应的标识线，	部分仓库堆码线不符合规范要求。	不符合要求
6	企业应为工作人员配置防静电的劳动工具及工作服，并督促工作人员正确使	暂未经营，后期严格执行。	符合要求

序号	《安全设施设计专篇》的对策措施	落实完成情况	结论
	用和穿戴。		

检查结果：11#回收库通风窗未设置丝网；部分仓库堆码线不符合规范要求；经整改符合要求。

单元评价结论：具备安全验收条件。

5.10 综合分析评价结果

评价组通过对资料审核，现场情况检查，小结如下：

- 1、资料审核单元符合安全条件。
- 2、总体布局、条件和设施单元符合安全条件。
- 3、安全防护设施单元有 1 项不符合安全条件，经整改符合要求。
- 4、周边环境符合安全条件。
- 5、通过重大危险源评价分析，该公司各储存单元均未构成烟花爆竹重大危险源。
- 6、现场检查单元有 4 项不符合安全条件，经整改后符合要求。
- 7、通过作业条件危险性评价，其储存运输作业单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的。
- 8、通过重大事故隐患判定，该项目不涉及重大隐患内的内容。
- 9、通过对建设项目安全“三同时”执行情况检查，建设项目按照“三同时”进行，对照《安全设施设计》中提出的安全对策措施，有 1 项不符合要求，经整改后符合要求。

6 安全对策措施、建议及整改

6.1 安全对策措施建议的依据及原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 整改意见及整改复查情况

6.2.1 整改意见

通过专家现场验收可以看出，项目尚存在下列问题，需要采取措施进行整改，使其符合国家法律、法规和标准要求。

6.2-1 存在问题及安全对策措施汇总表

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	部分仓库安全要素牌与设计图纸不一致，未明确责任人。	仓库安全要素牌应与设计图纸一致，应明确责任人。	中

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
2	部分仓库堆码线不符合规范要求。	仓库堆码线应按规范要求施划。	高
3	部分仓库门缝大，7#仓库装卸平台侧面未设置斜坡。	部分仓库门缝大的应封闭，7#仓库装卸平台侧面应设置斜坡。	中
4	11#回收库门前明沟应设置盖板，门的耐火极限不符合要求，通风窗未设置丝网。	11#回收库门前明沟应设置盖板，门应涂防火漆，通风窗应设置丝网。	高
5	库区未设置“一图一牌三清单”。	库区应设置“一图一牌三清单”。	中

6.2.2 整改复查情况

根据上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司整改回复，我公司对该公司烟花爆竹储存仓库迁建项目验收时专家所提出的整改建议内容进行了复查：

6.2-2 企业整改落实情况表

序号	现场检查发现的问题	整改情况	符合性
1	部分仓库安全要素牌与设计图纸不一致，未明确责任人。	仓库安全要素牌已与设计图纸一致，已明确责任人。	符合
2	部分仓库堆码线不符合规范要求。	仓库堆码线已按要求施划。	符合
3	部分仓库门缝大，7#仓库装卸平台侧面未设置斜坡。	部分仓库门缝大的已封闭，7#仓库装卸平台侧面已设置斜坡。	符合
4	11#回收库门前明沟应设置盖板，门的耐火极限不符合要求，通风窗未设置丝网。	11#回收库门前明沟已设置盖板，门已涂防火漆，通风窗已设置丝网。	符合
5	库区未设置“一图一牌三清单”。	库区已设置“一图一牌三清单”。	符合

6.3 安全管理对策措施及建议

管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，

企业应做到以下几点：

1、根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准，结合公司的实际情况，对制定的安全管理制度进行修改和完善；参照《烟花爆竹作业安全技术规程》以及相关的法规和标准对岗位操作规程进行修改和完善。安全管理制度制定后必须严格执行。

2、根据该企业实际情况进一步完善事故应急救援预案，并定期进行演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案。以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。

3、对危险场所进行定期检查，发现问题及时整改。安全检查应具体、全面，同时建议在安全检查时应作详细的检查记录，存档时间不少于1年，重要记录不少于3年，便于以后借鉴和提高安全管理水平。

4、应参照相关标准和法规，特别是《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012），对建筑物的情况进行安全检查，对与标准不符合之处进行整改，达到本质安全化的目的。

5、定期对从业人员进行安全技术培训教育，使其增强事故防范意识和能力，提高一旦发生事故后的应急能力。

6、对从业人员要进行职业性健康检查，并建立健康档案，发现健康问题及时采取措施。

7、企业应依法为烟花爆竹储存库相关的从业人员缴纳工伤保险费。

8、制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩，防止机动车辆未装防火罩而产生危险。

9、按《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）的要求完善相关场所的安全标识标志。

10、危险品储存库应按设计存放物品进行存储，不得超范围存放，不得超量存放。

11、该企业烟花爆竹储存库虽未构成重大危险源，但建议企业按重大危险源进行管理，保证必要的设备和资金投入，建立相应的安全管理规章制度。

12、加强对烟花爆竹运输和配送工作的管理，建立健全产品流向登记制度，完善相关的交接程序，避免烟花爆竹的遗失、被盗、错数。加强对运输车辆出车前后的检查，防止因车辆机械故障导致运输事故的发生。

13、企业应对每一工序制定详细的安全操作规程，作业人员应严格按照操作规程和作业规程进行作业，对搬运工、押运员和司机等要定期和不定期进行体能测试和安全教育，培训。

14、门卫室内建议张贴当地政府有关部门和企业领导报警联系电话。

15、公司根据《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》，制定了事故应急救援预案，内容基本符合导则要求，提供了事故应急救援预案编制项目的编制要求，供公司参考。在事故应急救援预案方面提出以下建议：

(1) 事故应急救援预案应定期组织演练，根据演练过程发现的问题不断修改、完善预案。

(2) 事故应急救援预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。应急措施能否有效的实施在很大程度上取决于预案与实际情况是否相符以及准备是否充分。公司应保证应急救援组织正常运行，各项应急救援器材齐备、完好，对灭火器、消防水泵应定期进行检查，保留检查记录。

(3) 根据《烟花爆竹安全管理条例》，发生烟花爆竹事故时公司应立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。救援时应按照以下原则进行，防止灾害扩大：

①立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；

②迅速控制危害源，并对事故造成的危害进行检验、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；

③针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

(4) 建立义务消防队伍，定期进行消防演习；仓库应明确 1 名消防设施安全管理人员，全面负责仓库消防设施、器材管理，确保完好有效。

(5) 本单位应急预案应定期向主管部门进行备案。

16、该公司C级架子烟花类产品只能销售给有资质的专业燃放作业单位，不能销售给个人。

6.4 安全技术对策措施及建议

6.4.1 运输安全对策措施

1、按照《安全生产法》规定，应配备专（兼）职安全员和具备特种行业运输押运资格的相关运输、押运员各1名。

2、禁止不符合烟花爆竹运输要求的车辆进入库区装卸产品。

3、危险品运输车辆的技术状况必须经法定部门认定的检测机构检测合格，运输前、检查车况是否良好。

4、车厢、底板必须平坦完好，周围栏板、箱柜必须牢固，铁质底板装运危险物品时应采取有效防护措施，并配置消防器材。

5、运输车辆排气管必须装隔热和火星防护装置，进入危险品仓库区，排气管必须装上熄灭火星装置。

6、运输车辆电路系统应有切断总电源装置。

7、运输车辆车身有统一的颜色和图案，前后必须悬挂易燃易爆“危险品”警示标志。

8、储存库区内运输道作业中，危险品驾驶员在转运、驾驶时，应按照国家企业制定的规章制度作业，并严格控制车速。

9、装卸作业中，只许单件搬运，不得碰撞、拖拉、磨擦、翻滚和剧烈振动，不许使用铁撬等铁质工具。

10、进入仓库区的机动车辆，必须有静电消除防火花装置。

6.4.2 储存安全对策措施

1、入库的成品应贴有明显的标签，包括名称、产地、出厂日期、危险等级和重量等。

2、危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛边长不应超过10m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；

搬运通道的宽度不宜小于 1.5m。

3、成品成箱堆垛高度不超过 2.5m。

4、库房内木地板，垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板外表面 3mm 以上，钉孔要用油灰填实。

5、严禁在库房内进行拆包、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。

6、库内应保持整洁，干燥，通风，箱垛堆码整齐，严禁超过核定的储量存放烟花爆竹。禁止非法生产的或收缴的、无检验合格证的、超过有效期的烟花爆竹与正常产品同库存放。

7、清退的烟花爆竹宜单独存放并注明品种和数量。变质和过期失效的烟花爆竹，应当及时清理出库，并报请有关部门组织监督销毁。

8、加强对烟花爆竹出入库的管理，完善出入库记录、流向（配送）记录，库存产品应做到帐、卡、物相符。

9、严禁野蛮装卸的行为，人工搬运烟花爆竹产品时一人限一箱，并做到轻拿轻放。禁止采用不符合规定的车辆或工具运送烟花爆竹。

10、严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧物品带入仓库区内，严禁无关人员进入仓库区或在库区内进行其它无关活动。

11、视频监控系统应采取防止雷电波侵入的措施，建议在主机前端安装防电涌保护器和其它电气保护装置，值守人员应熟练掌握视频系统的操作方法，视频监控系统应能 24h 保持工作。

12、对库区的安全设施（防雷、消防）和技防装备实行挂牌管理，落实日常管理责任，定期检测、检查和维护，以确保库区安全设施和技防范装备始终处于良好的工作状态。

6.5 其他对策措施及建议

1、防护用品

应根据工作性质和劳动条件，配备符合国家或行业标准的防静电劳动防护用品，并执行检查和使用制度。严禁穿戴化纤织品的防护用品。

2、人员要求

1) 新进和变换工种的工人必须进行安全教育和技术培训，取得操作合格证后，才能上岗生产。

2) 严禁穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹，刀剪、锁链等进入危险库内。

3) 严禁酒后上班。

3、装卸过程安全对策措施

1) 搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。

2) 禁止吸烟。

3) 禁止燃放烟花爆竹。

4) 机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。

5) 装卸时应由保管员监装监卸。

6) 机动车不应直接进入 1.3 级建筑物内，装卸作业在各级危险性建筑物门前大于 2.5m 以外进行。

4、储存条件和环境

1) 储存条件

工人入库时应保持门、窗开启通风正常。库区必须按规定设置消防器材和消防设施，工人入库最好配有蓄水的消防桶。

在含有下列情况之一者，应停止搬运，慎重处理。

(1) 电源线路发生漏电、短路和其它情况不正常时；

(2) 大雷暴雨时；

(3) 药物温度自发升高或产生异味时；

(4) 室温超过 45℃时。

2) 储存环境

(1) 库区附近应种植有抗污染性能的绿化植物，保持地面整洁，无散件、漏药。

(2) 库房内应有测温、测湿计和报警装置，便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记，作好防潮防漏、降温、通风处理。

(3) 定期清理防火隔离带，确保防火安全。

(4) 应在库房内地面做防潮措施。在雷雨天气应加强巡逻，应重点查看仓库的防漏、防潮情况，防止药物受潮发热引发自燃自爆。

(5) 清扫前，应将成品搬离。

5、其他对策措施建议

1) 库区安全距离范围内，有人员经过或劳作的地方应设置区域危险警示标志。

2) 库区安全距离内，有人员密集、车辆经过的地方应设置区域危险、车辆慢行、禁止聚集等警示。

3) 对突发性事故，如地震、洪灾等紧急情况，必须立即启动相应应急预案，及时采取应急措施，防止事态扩大。

4) 做好使用期的地质灾害预警和防灾预案工作。

5) 上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存库区消防设施应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求完善。

6) 建议企业库区内建筑物防雷装置设施应定期进行检测。

7) 建议企业按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）要求设置视频监控系统，值守人员要加强监控设备的管理，熟练掌握其性能，按规程操作，保证设备能适时处于工作状态，防止出现“盲区”或“死角”。当条件具备时，视频监控设备尽快与主管部门联网运行。设施设备一旦损坏、失效，24小时内必须上报相关部门，做好值班记录，增强人力防范。

7 安全验收评价结论

7.1 评价结果

该项目可存在的危险、有害因素是：火灾爆炸、中毒、车辆伤害、物体打击及触电等。其中以火灾、爆炸为主要危险有害因素。

根据国家法律法规和行业的相关标准及规定，本次安全评价以上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目及附属配套设施为评价对象，通过对业主提供资料的研究分析和现场勘察，对该仓库可能存在的危险、有害因素进行了辨识和分析，对其中存在的主要危险、有害因素进行了定性、定量评价，然后提出了相应的安全对策措施建议，形成评价结论。

各评价单元的评价结果见表 7.1-1。

表 7.1-1 项目的评价结果表

序号	单元	可能发生的事故	评价方法	评价结果
1	安全生产基本资料审核单元	/	安全检查表	符合安全条件。
2	总体布局、条件和设施单元	/	安全检查表	符合安全条件。
3	安全防护设施单元	/	安全检查表	安全防护措施单元有 1 项整改后符合安全条件。
4	周边环境危险性单元	/	安全检查表	周边环境符合安全条件。
5	重大危险源	/	/	未构成烟花爆竹重大危险源。
6	现场检查单元	火灾、爆炸、坍塌、雷击	安全检查表	现场检查单元有 4 项整改后符合安全条件。
7	储存运输作业单元	火灾、爆炸、车辆伤害	作业条件危险性分析	高度危险 2 项；显著危险 9 项；一般危险 4 项；稍有危险 2 项。 单元的风险是可以避免或控制，在保证现有安全条件和落实安全措施（包括应急措施）的情况下，事故风险是可以接受的。

序号	单元	可能发生的事故	评价方法	评价结果
8	重大事故隐患判定	/	安全检查表	该项目不涉及重大隐患内的内容。
9	安全“三同时”检查	/	安全检查表	建设项目按照“三同时”进行，对照《安全设施设计》中的安全对策措施，有1项经整改后符合要求。

7.2 评价结论

通过对上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全验收评价，现得出以下结论：

1、根据2022年08月22日上饶市广丰区人民政府专题会议纪要（上饶市广丰区人民政府办公室第33号）精神，同意由上饶市广丰区发展和改革委员会对该公司搬迁到洋口镇范围内的烟花爆竹仓库储存项目依法依规予以立项。2022年08月24日上饶市广丰区发展和改革委员会就该项目下发了《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：

2208-361122-04-01-682935，项目建设地址位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村，符合项目备案有关规定。该公司委托江西省赣华安全科技有限公司于2023年04月出具《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全预评价报告》，委托山东鸿运工程设计有限公司进行安全设施设计，并取得由上饶市应急管理局颁发《上饶市烟花爆竹批发企业新改、扩建项目设计审查备案意见书》（编号202301），经过设计变更后于2023年10月出具《上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目安全设施设计》。

2、该项目建设文件资料基本齐全，工程选择的场址和总平面布置符合国家相关法律法规、标准、规章、规范要求。

3、该项目总平面布置、功能分区合理；建筑物耐火等级、防火间距符合《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）等规范的要求。

4、该项目不构成烟花爆竹重大危险源，但建议企业按照重大危险源进

行安全管理，制订完善事故应急救援预案，配置有关的应急救援设施、设备，并定期演练不断完善。

5、该项目实施后应重点防范的危险因素为火灾爆炸，对易发生火灾爆炸的烟花爆竹产品应加强巡视及管理，做好烟花爆竹储存库区火灾爆炸事故的专项应急预案和现场处置方案，确保仓储安全和疏散安全。

6、该项目烟花爆竹仓库建筑工程、运输单元安全措施、防雷防静电设施等设施符合规范要求，能够满足烟花爆竹库区的储存要求。

7、该项目按照安全“三同时”进行，落实了《安全设施设计》中提出的安全对策措施。

8、建设单位对本报告中所提出的危险、有害因素应引起重视，将本报告中提出的安全对策措施、建议，在储存、经营及日常安全管理过程中考虑、补充。

9、安全管理

1) 该企业已建立了安全生产责任制，防火防爆安全管理责任制度，建立了包括安全教育、安全检查、安全检修等各类事故管理责任制度和事故应急预案，事故应急预案已在上饶市应急管理局备案。

2) 该企业成立了安全工作领导小组，配备了专职安全管理人员。主要负责人、安全管理人员、和特种作业人员已培训考核合格，待发上岗资格证书。

3) 落实了员工的安全技术培训、岗位技能培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。对新从业人员实行先安全生产教育培训，后上岗制度。

4) 在安全教育培训、劳动防护用品、安全设施等方面做了相应的安全投入。该企业为员工进行了工伤保险并提供了相关手续。

5) 针对评价过程中发现的安全隐患和提出的整改意见，该企业已作出了相应的整改。

结论：我公司项目评价组经综合以上分析认为，上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目的平面布置、建构物、安全

设备设施、安全管理符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）、《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）等规范规定，符合相关的法律、法规、标准的规定，根据《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条（三）和《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）第六条的规定及其条文说明，该公司烟花爆竹库房储存能力和经营规模符合相关标准要求，该公司主要危险和有害因素对象在采取本报告所要求的安全对策措施后，其风险可以被控制在可接受的程度。

通过对上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司烟花爆竹储存仓库迁建项目总体评价：上饶市广丰区昌鑫烟花鞭炮销售有限公司位于江西省上饶市广丰区洋口镇古城村的烟花爆竹储存库能够达到储存、经营（批发）组合烟花类（C、D）级、架子烟花类（C）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（C）级、升空类（C）级、旋转类（C、D）级、喷花类（C、D）级、爆竹类（C）级产品的安全条件，具备安全验收的条件。

附件目录

- 附件1：现场照片；
- 附件 2：安全验收评审意见
- 附件 3：整改回复及整改后照片；
- 附件 4：委托书；
- 附件 5：营业执照；
- 附件 6：烟花爆竹经营（批发）许可证；
- 附件 7：政府相关文件及项目备案文件；
- 附件 8：土地相关材料；
- 附件 9：安全设施设计审查批复；
- 附件 10：主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员证书证明；
- 附件 11：工伤保险、安全生产责任保险；
- 附件 12：防雷、防静电检测报告；
- 附件 13：网络视频监控系统验收报告；
- 附件 14：配送车辆相关材料；
- 附件 15：应急预案备案登记表；
- 附件 16：安全生产管理制度、操作规程目录；
- 附件 17：设计变更情况说明；
- 附件 18：50 人以下证明；
- 附件 19：预评单位资质；
- 附件 20：设计单位资料。
